




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		PROYECTO REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE 180 dias		lun 10/02/23	mar 03/19/24
		INSTALACIONES PARA ESPACIO TECNOLOGICO			
		PARQUE OMAR			
2		PRELIMINARES	30 dias	lun 10/02/23	lun 10/30/23
3		INSTALACIONES TEMPORALES	5 dias	lun 10/02/23	vie 10/06/23
4		PLACA DE MARMOLINA	15 dias	lun 10/02/23	lun 10/16/23
5		SIEMBRA DE ARBOLES	30 dias	lun 10/02/23	lun 10/30/23
6		DEMOLICION DE ESTRUCTURA	44 dias	lun 10/30/23	dom 12/10/23
7		DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUES	9 dias	lun 10/30/23	mar 11/07/23
8		DEMOLICIÓN DE LOSETA DE HORMIGÓN	4 dias	mar 11/07/23	sáb 11/11/23
9		DEMOLICIÓN DE SOBRE DE LAVAMANOS	4 dias	sáb 11/11/23	mié 11/15/23
10		DEMOLICIÓN DE MACETAS RELLENAS	4 dias	mié 11/15/23	dom 11/19/23
11		DEMOLICIÓN DEL MUEBLE DE COCINA	4 dias	dom 11/19/23	mié 11/22/23
12		DEMOLICIÓN DE VENTANAS FRANCESAS	4 dias	jue 11/23/23	dom 11/26/23
13		DEMOLICIÓN DE PUERTAS	3 dias	dom 11/26/23	mié 11/29/23
14		DEMOLICIÓN DE TECHOS	4 dias	mié 11/29/23	dom 12/03/23
15		DEMOLICIÓN DE CIELO RASO	4 dias	dom 12/03/23	jue 12/07/23
16		DEMOLICIÓN DE PISO DE CERAMICA	4 dias	jue 12/07/23	dom 12/10/23
17		ESTRUCTURA	5 dias	dom 12/10/23	vie 12/15/23
18		CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON PULIDO	5 dias	dom 12/10/23	vie 12/15/23
19		CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE CONCRETO	2 dias	dom 12/10/23	mar 12/12/23
20		INSTALACION DE COLUMNAS DE TUBOS	3 dias	mar 12/12/23	vie 12/15/23
21		TECHO	10 dias	vie 12/15/23	dom 12/24/23
22		INSTALACION DE TECHO TRASLUCIDO	4 dias	vie 12/15/23	mar 12/19/23
23		INSTALACION DE CANAL	3 dias	mar 12/19/23	vie 12/22/23
24		INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES	3 dias	vie 12/22/23	dom 12/24/23
25		PAREDES	11 dias	mar 12/19/23	vie 12/29/23
26		CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUE	6 dias	mar 12/19/23	dom 12/24/23
27		CONSTRUCCION DE PAREDES DE GYPSUM	5 dias	lun 12/25/23	vie 12/29/23
28		ELECTRICIDAD	44 dias	mar 12/19/23	lun 01/29/24
29		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS MONOFASICOS	4 dias	mar 12/19/23	sáb 12/23/23
30		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	4 dias	sáb 12/23/23	mar 12/26/23

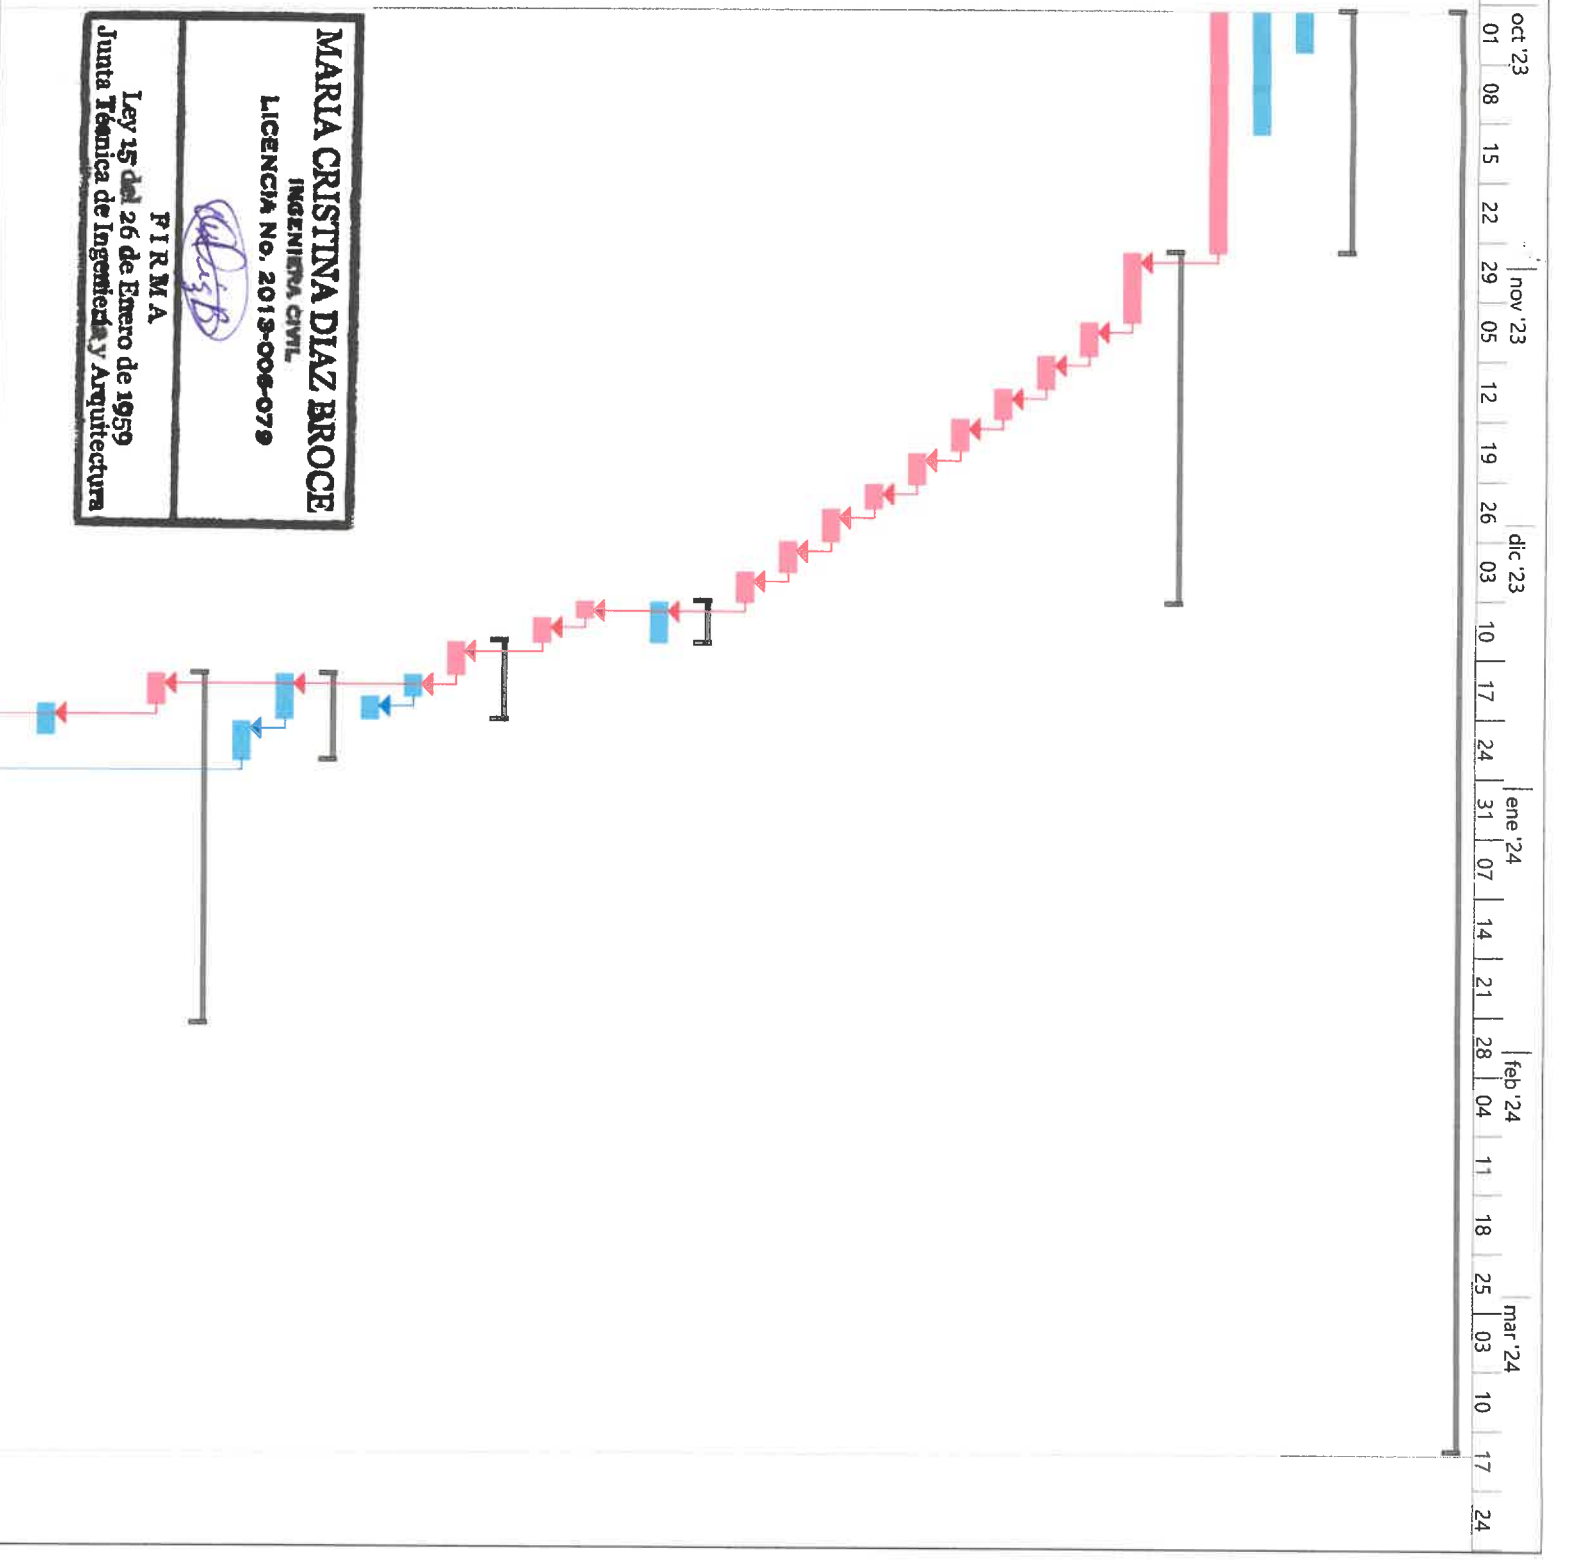

Tarea: Tarea inactiva (blue bar), Tarea manual (grey bar), solo duración (grey bar)
 División: División inactiva (dotted line), Resumen inactivo (grey bar), Resumen manual (grey bar), Resumen del proyecto (grey bar)
 Hitos: Hitos inactivos (grey diamond), Hitos manuales (grey bar), solo el comienzo (grey bar), solo fin (grey bar), Tareas externas (grey bar)
 Informes: Informe de resumen manual (blue bar), Tareas críticas (red bar), División crítica (red bar), Progreso manual (blue bar)
 Hitos externos: Hitos externos (grey diamond), Fecha límite (grey bar), Tareas críticas (red bar), Progreso (blue bar)

Proyecto: CRONOGRAMA DAS
 Fecha: lun 09/11/23

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
31		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES 110V SENCILLOS CABLEADOS	30 dias	sáb 12/23/23	sáb 01/20/24
32		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA 220 V PARA AA CABLEADOS	30 dias	sáb 12/23/23	sáb 01/20/24
33		SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHS	4 dias	sáb 01/20/24	mié 01/24/24
34		SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOTS	4 dias	mié 01/24/24	sáb 01/27/24
35		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	5 dias	mié 01/24/24	dom 01/28/24
36		SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	5 dias	mié 01/24/24	dom 01/28/24
37		INSTALACION DE MANUAL - SIRENAS	1 dia	dom 01/28/24	lun 01/29/24
38		PLOMERIA	4 dias	vie 12/29/23	mar 01/02/24
39		INSTALACION DE AGUA POTABLE	4 dias	vie 12/29/23	mar 01/02/24
40		INSTALACION DE AGUAS SANITARIAS	4 dias	vie 12/29/23	mar 01/02/24
41		VOZ Y DATA	16 dias	dom 01/28/24	lun 02/12/24
42		TUBERIA FICHADAS VOZ Y DATOS	4 dias	dom 01/28/24	jue 02/01/24
43		ARMARIO PARA SISTEMAS ESTRUCTURADOS	4 dias	jue 02/01/24	lun 02/05/24
44		RACK 42 CANALES	4 dias	lun 02/05/24	vie 02/09/24
45		JACK CAT 6 ROJO Y AZUL	4 dias	vie 02/09/24	lun 02/12/24
46		VENTANAS	4 dias	vie 12/29/23	mar 01/02/24
47		INSTALACION DE VENTANAS FRANCESAS	1 dia	vie 12/29/23	sáb 12/30/23
48		INSTALACION DE VENTANAS DE VIDRIO CON PERFIL DE ALUMINIO	3 dias	sáb 12/30/23	mar 01/02/24
49		ACABADOS	11 dias	jue 02/01/24	dom 02/11/24
50		INSTALACION DE PISOS	5 dias	jue 02/01/24	mar 02/06/24
51		CONFECCION DE NICHOS DE GYPSUM	4 dias	jue 02/01/24	lun 02/05/24
52		APLICACIÓN DE PINTURA DE PAREDES	8 dias	jue 02/01/24	vie 02/09/24
53		INSTALACION DE PAPEL TAPIZ	3 dias	vie 02/09/24	dom 02/11/24
54		PUERTAS	4 dias	vie 02/09/24	lun 02/12/24
55		INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	2 dias	vie 02/09/24	sáb 02/10/24
56		INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE VIDRIO	2 dias	dom 02/11/24	lun 02/12/24
57		ACABADOS DE BAÑOS	18 dias	dom 02/11/24	mar 02/27/24
58		INSTALACION DE INODOROS	2 dias	dom 02/11/24	lun 02/12/24
59		INSTALACION DE LAVAMANOS	2 dias	lun 02/12/24	mié 02/14/24
60		INSTALACION DE URINAL	2 dias	mié 02/14/24	vie 02/16/24
61		CONSTRUCCION DE LAVAMANO DE CONCRET(3 dias	3 dias	vie 02/16/24	lun 02/19/24
62		INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑOS (PORTA PAPEL, BARRAS)	2 dias	lun 02/19/24	mié 02/21/24

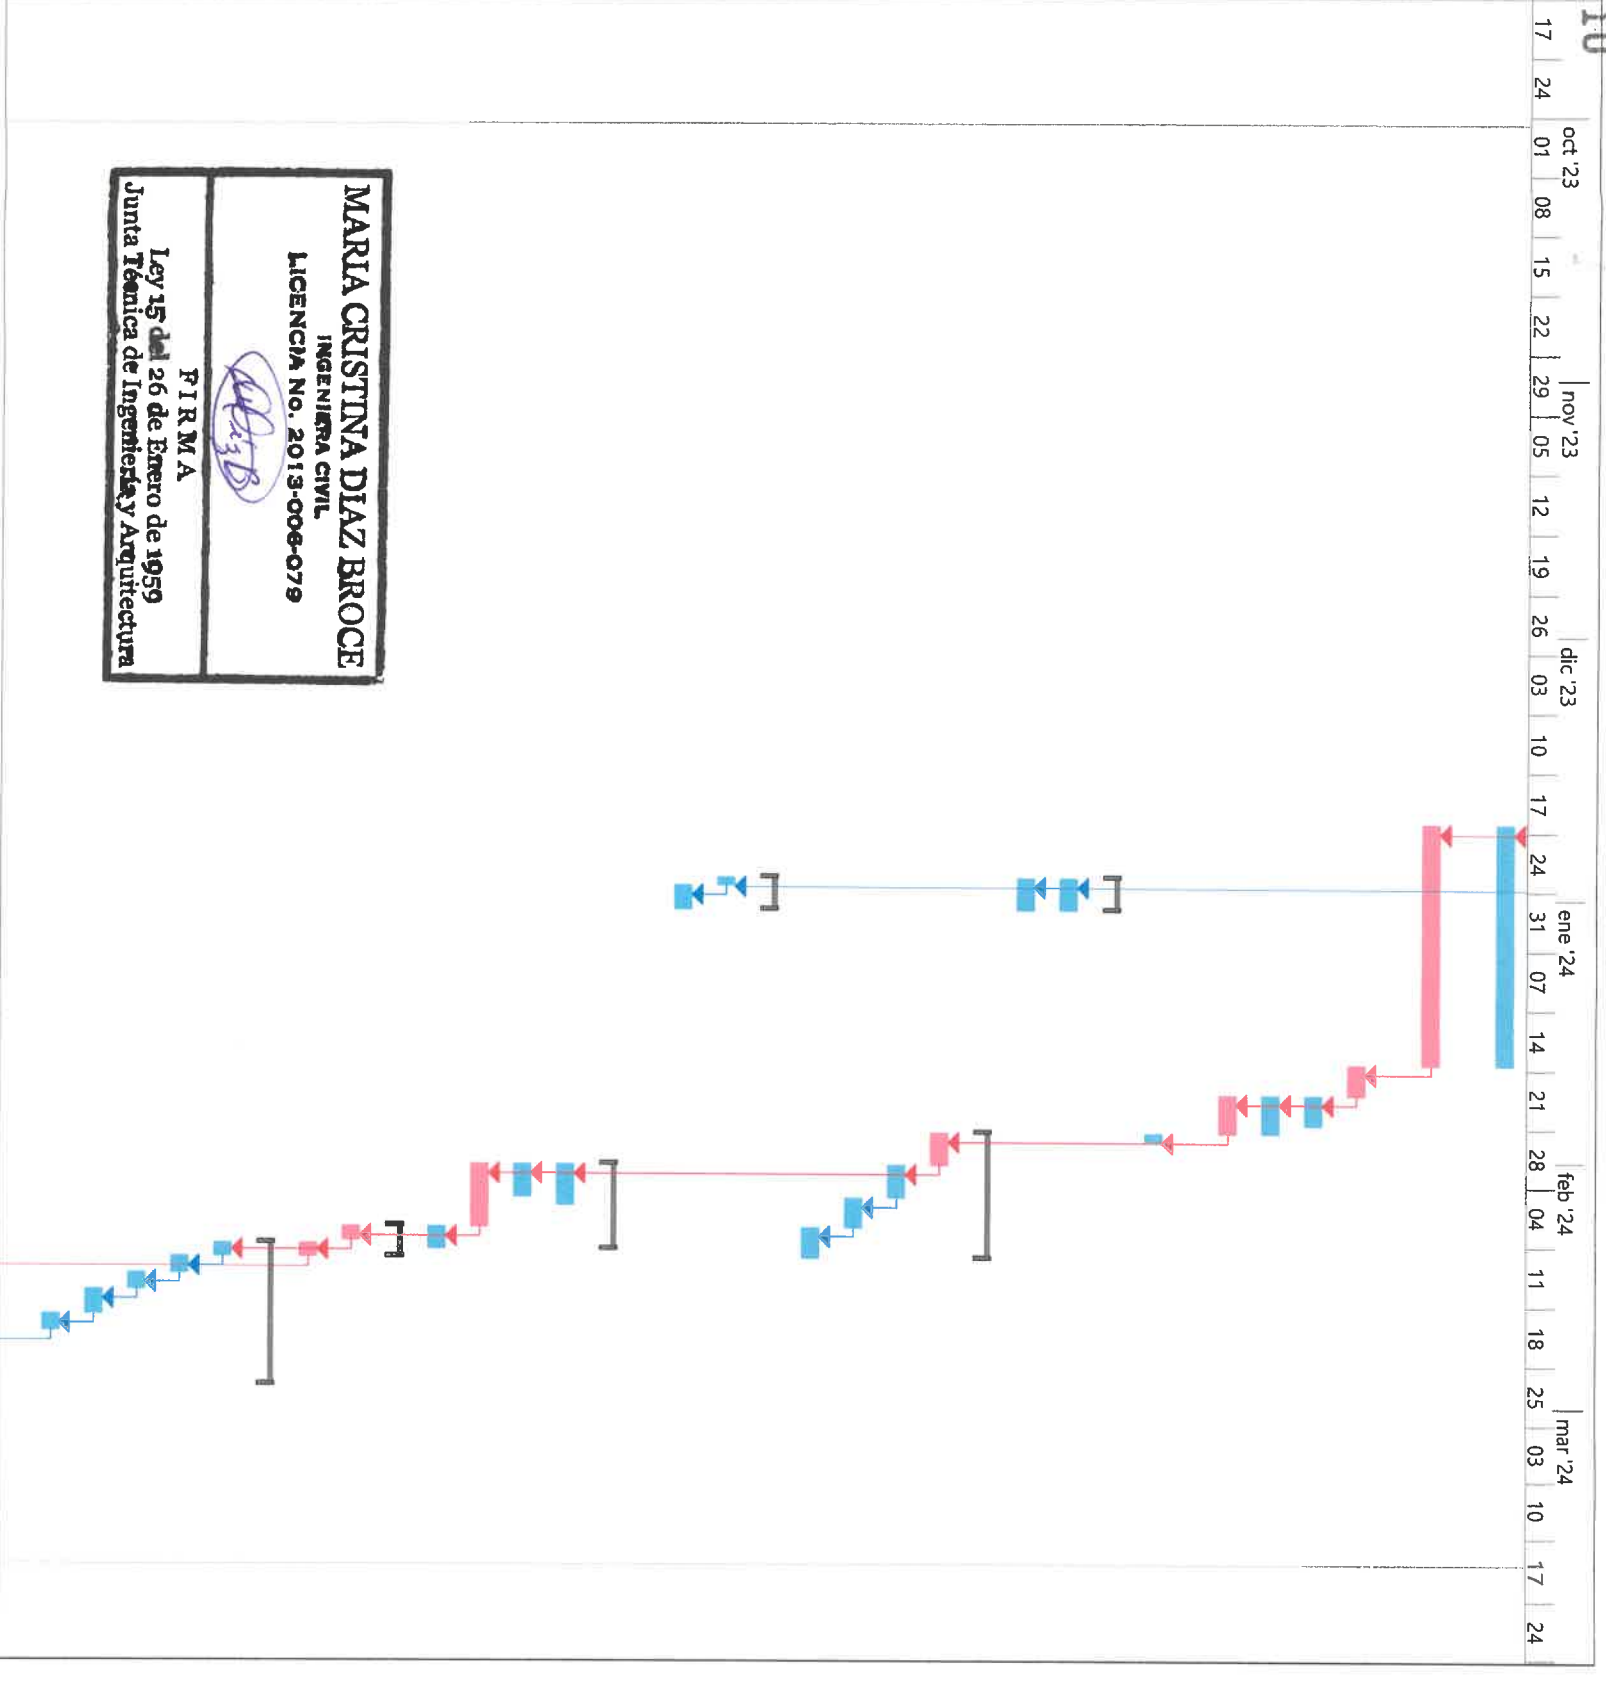

Proyecto: CRONOGRAMA DAS
Fecha: lun 09/11/23


Tarea
 Tarea inactiva: [Barra azul con puntos] | Informe de resumen manual: [Barra azul] | Hitos externos: [Barra azul con triángulo] | Progreso manual: [Barra azul con triángulo]

División
 Hitos: [Barra azul con triángulo] | Resumen inactivo: [Barra azul con puntos] | Resumen manual: [Barra azul] | Fecha límite: [Barra azul con triángulo] | Tareas críticas: [Barra azul con triángulo] | Progreso: [Barra azul con triángulo]

Resumen
 Resumen del proyecto: [Barra azul] | Tarea manual: [Barra azul] | solo duración: [Barra azul] | solo el comienzo: [Barra azul] | solo fin: [Barra azul] | Tareas externas: [Barra azul] | División crítica: [Barra azul con triángulo]

[Firma manuscrita]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		
						Inicio	Fin
63	→	INSTALACION DE MAMPARAS DIVISIONES DE BAÑOS	5 días	mié 02/21/24	Lun 02/26/24		
64	→	INSTALACION DE ESTANTERIAS DE ALUMINIO	2 días	Lun 02/26/24	mar 02/27/24		
65	→	ADECUAMIENTO DE CUARTO PERSONAL MANTENIMIENTOS	8 días	Lun 02/12/24	mar 02/20/24		
66	→	INSTALACION DE SOFA 3 PUESTOS	2 días	Lun 02/12/24	mié 02/14/24		
67	→	INSTALACION DE NEVERA	2 días	mié 02/14/24	vie 02/16/24		
68	→	INSTALACION DE MESAS Y SILLAS	2 días	vie 02/16/24	dom 02/18/24		
69	→	INSTALACION DE MICROONDAS, CAFETERAS	2 días	dom 02/18/24	mar 02/20/24		
70	→	ADECUACIONES DE COCINA	11 días	Lun 02/12/24	vie 02/23/24		
71	→	INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA	5 días	Lun 02/12/24	sáb 02/17/24		
72	→	INSTALACION DE FREGADOR DOBLE	2 días	sáb 02/17/24	Lun 02/19/24		
73	→	INSTALACION DE ESTUFA DE INDUCCION	2 días	Lun 02/19/24	mié 02/21/24		
74	→	INSTALACION DE NEVERA DE 2 PUERTAS 19PIES3	2 días	mié 02/21/24	vie 02/23/24		
75	→	MOBILIARIO	15 días	vie 02/23/24	vie 03/08/24		
76	→	INSTALACION DE SILLA ALTA	2 días	vie 02/23/24	dom 02/25/24		
77	→	INSTALACION DE MESA REVESTIDA LAMINA PVC	2 días	dom 02/25/24	Lun 02/26/24		
78	→	INSTALACION DE ESCRITORIOS	3 días	mar 02/27/24	Jue 02/29/24		
79	→	INSTALACION DE SILLAS DE ESCRITORIOS	2 días	Jue 02/29/24	sáb 03/02/24		
80	→	INSTALACION DE SILLAS DE VISITA	2 días	Jue 02/29/24	sáb 03/02/24		
81	→	INSTALACION DE SOFA DE CUERO	2 días	sáb 03/02/24	Lun 03/04/24		
82	→	INSTALACION DE MESA DE CONFERENCIA	2 días	sáb 03/02/24	Lun 03/04/24		
83	→	INSTALACION DE MESA ALTA	2 días	Lun 03/04/24	mié 03/06/24		
84	→	INSTALACION DE TABLERO	2 días	mié 03/06/24	vie 03/08/24		
85	→	SISTEMA DE SEGURIDAD	20 días	Jue 02/29/24	mar 03/19/24		
86	→	INSTALACION DE SENSORES MAGNETICOS	4 días	Jue 02/29/24	Lun 03/04/24		
87	→	INSTALACION DE SIRENAS	4 días	Lun 03/04/24	vie 03/08/24		
88	→	INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL NUMERICO	4 días	vie 03/08/24	mar 03/12/24		
89	→	INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE SEGURIDAD	4 días	mar 03/12/24	vie 03/15/24		
90	→	INSTALACION DE KITS DE ALIMENTACION CAJA AC 110V	4 días	vie 03/15/24	mar 03/19/24		
91	→	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	2 días	sáb 03/02/24	Lun 03/04/24		
92	→	INSTALACION DE UNIDADES DE AA	2 días	sáb 03/02/24	Lun 03/04/24		



Tarea ■ Tarea inactiva ■

División ■ Hitos inactivo ■

Hitos ◆ Resumen inactivo ■

Resumen ■ Tarea manual ■

Resumen del proyecto ■ solo duración ■

Informe de resumen manual ■ Hitos externo ■

Resumen manual ■ solo el comienzo ■ Fecha límite ■

Hitos ■ solo fin ■ Tareas críticas ■

Tareas externas ■ Hitos ■ División crítica ■

Progreso ■ Progreso manual ■

[Signature]
