

"DOCUMENTOS Y PRECIOS"

Licenciado
FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ
Director Nacional
Dirección de Asistencia Social

Proyecto 61547 "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA
FÉ"

Proponente "ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Panamá, 07 de septiembre de 2023

Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

REGISTRO PÚBLICO



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: GLADYS EVELIA
JONES CASTILLO
FECHA: 2023.08.03 14:15:42 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Gladys E. Jones

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

320177/2023 (0) DE FECHA 03/08/2023

QUE LA SOCIEDAD

ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 366434 (S) DESDE EL LUNES, 30 DE AGOSTO DE 1999
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ROBERTO BATISTA REYES
SUSCRIPTOR: ELIZABETH GARRIDO
SUSCRIPTOR: LUCILLE BATISTA DE RODRIGUEZ

DIRECTOR / PRESIDENTE: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
DIRECTOR / SECRETARIO: ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO
DIRECTOR / TESORERO: ROBERTO BATISTA REYES

AGENTE RESIDENTE: ROBERTO VIRGILIO BATISTA GARRIDO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS
EL CAPITAL ES DE 10,000.00 BALBOAS REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE 100.00 BALBOAS CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN FORMA NOMINATIVA, PROHIBIENDOSE LA EMISION DE ACCIONES AL PORTADOR. ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 3 DE AGOSTO DE 2023A LAS 1:29 P. M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1404186639



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 095D4A48-42BE-4645-9196-C7775CBF316C
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

**PODER
DE
REPRESENTACIÓN**




CARTA PODER


La suscrita Elizabeth Garrido de Batista, mayor de edad, portadora del documento de identidad No. 8-208-366, en su calidad de Representante Legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., inscrita a folio 366434, con domicilio en Calle 43 Bella Vista, Edif. Sousa, planta baja, apto LL por este medio confiero Poder Especial, amplio y suficiente, a Gabriel Núñez, mayor de edad, portador del documento de identidad E-8-172252, para que actúe como nuestro representante en el acto público para el proyecto No. 61547, denominado "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE" a celebrarse el día 7 (siete) de septiembre de 2023.

Nuestro representante queda por este medio expresamente facultado para presentar propuesta, cotizar y comprometerse en nuestro nombre.

En fe de lo anterior se firma este documento en la ciudad de Panamá, hoy 4 (cuatro) de septiembre de 2023 (dos mil veinte y tres)


Elizabeth Garrido de Batista
8-208-366




Gabriel R. Núñez S.
E-8-172252.

Yo, ~~Jorge Eliezer Gantes Singh~~, Notario Público primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 8-509-985

CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s), ante mi y los testigos que suscriben, por tanto, sus firmas son auténticas.

Fdo. Notario: Panamá,

05 SEP 2023


Testigo


Testigo

Jorge Eliezer Gantes Singh
Notario Público Primero

**PAZ Y SALVO
DE RENTA**



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE
INGRESOS

DOCUMENTO 303003220173
ESTADO APROBADO
FECHA 21/08/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

FORM.303-1

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Número de Control: 90d0087d

Fecha de Emisión

Hora de Emisión

Fecha de Validez

21/08/2023

01:54:37 p. m.

20/09/2023

La Administración Regional de Ingresos de Panamá certifica que el Contribuyente identificado con **RUC: 17434-1-366434** y **Nombre o Razón Social: ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.**, se encuentra a **Paz y Salvo** con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esta certificación se emite SIN INFORMACIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL.

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Para su validez, esta certificación debe ser verificada en la dirección de Internet: dgi.mef.gob.pa de la DGI, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse.

Este Paz y Salvo es gratis.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema y la fecha:

Fecha:	Número de confirmación:
21/08/2023 01:58 p.m.	303102827242

Persona responsable de verificación del Paz y Salvo:

Nombre: Milagro De La Cruz

Firma: 

RECUERDE IMPRIMIR Y GUARDAR ESTE DOCUMENTO COMO SOPORTE DE LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAZ Y SALVO



PAZ Y SALVO

DEL PAGO

CUOTA

OBRERO

PATRONAL



Certificado de paz y salvo



Certificado de paz y salvo

No. de CERTIFICADO

MN065GS4-UYEUR



INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL DOCUMENTO

CAJA DEL SEGURO SOCIAL

Por medio del presente documento se emite este certificado de paz y salvo a:

Número patronal: 80-400-00139
RUC/CIP: 17434-1-366434
Nombre comercial: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Razón social: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Periodo: 2023-07-01 Válido hasta: 2023-09-30
Motivo: PAZ Y SALVO



Este certificado de paz y salvo fue emitido por el sitio web <http://pazysalvos.css.gob.pa>
Generado: 2023-09-01 05:43

**PAZ Y SALVO
DEL
MINISTERIO
DE AMBIENTE**



MINISTERIO DE AMBIENTE

República de Panamá
Ministerio de Ambiente
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo
N° 225559

Fecha de Emisión:

05	09	2023
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

05	10	2023
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

Representante Legal:

ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO

Inscrita


Tom o	Folio	Asiento	Rollo
			17434
Ficha	Imagen	Documento	Finca
366434	1		

Se encuentra PAZ y SALVO, con el Ministerio del Ambiente, a la fecha de expedición de esta certificación.

Certificación, válida por 30 días

Firmado

Agdmir Santos
Jefe de la Sección de Tesorería.



**DECLARACIÓN
JURADA DE
MEDIDAS DE
RETORSIÓN**



DECLARACIÓN JURADA DE MEDIDAS DE RETORSIÓN

Panamá, 4 de septiembre de 2023

Francisco Israel Rodríguez
Director Nacional
Dirección de Asistencia Social
Ministerio De La Presidencia
E.S.D.

Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito **ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA**, mujer panameña, mayor de edad, empresaria, casada, con cédula de identidad personal N° **8-208-366**, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, según Folio **366434**, con domicilio en **CALLE 43, BELLA VISTA**, Teléfono: **6673-9671**; bajo la gravedad de juramento declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un país al que se le aplican medidas de retorsión o una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016;
3. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona natural de un Estado al que se aplican las medidas de retorsión o de una persona jurídica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecución del procedimiento de selección de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o jurídica, de Derecho Público o de otra índole, correspondiente o cualquier combinación de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsión conforme a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, no superará el diez (10%) del valor total del Acto Público o contratación pública de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho Acto Público o contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de septiembre de 2023.


Elizabeth Garrido de Batista
Cedula: 8-208-366
Roberto Batista e Hijos S.A.



Yo, **JORGE E. GANTES S.** Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cédula de identidad personal No 8-509-985

CERTIFICO:
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como
suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s)
es (son) auténtica(s)

Panamá, **05 SEP 2023**

Testigos

Testigos


Medo. Jorge E. Gantes S
Notario Público Primero

④

**IDONEIDAD DE
LA JUNTA
TECNICA DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA**

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 (Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCIÓN #0310
 (14 de marzo de 2023)

"Por medio de la cual se declara que en los registros de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura se ha inscrito la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** por un periodo de dos años, contando a partir de la fecha de la presente Resolución".

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSIDERANDO:

Que en memorial presentado por **ELIZABETH VIDAL GARRIDO PACHECO DE BATISTA** de nacionalidad **PANAMEÑA** con cédula de identidad personal No. **8-208-366**, Representante Legal de la empresa denominada **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** inscrita en el Registro Público con Folio **366434**, con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, con domicilio en **CALLE 43, EDIFICIO SOUSA, DIAGONAL AL BAC**, corregimiento de **BELLA VISTA**, distrito de **PANAMA**, provincia de **PANAMA**, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, se le extienda el Certificado de Registro de Empresa para ejercer en el territorio de la República de Panamá las obras y/o actividades a continuación detalladas, además, que toda la información es verdadera y dando fé de ello.

Que según la documentación presentada por dicha empresa, ésta cumple con los requisitos exigidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para la expedición del Certificado de Registro de Empresa y que la documentación cumple con las disposiciones que regulan el ejercicio de las profesiones de ingeniería y/o arquitectura del país para realizar las actividades solicitadas.

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar que la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** con número de RUC **17434-1-366434** y dígito verificador **27**, quede inscrita en los Registros de la Junta Técnica para ejercer en el territorio de la República de Panamá, por un periodo de dos años como lo dispone la Resolución 824 de 2009, a partir de la fecha de la presente Resolución; extenderle el Registro de Empresas y autorizarla para ejecutar las obras y/o actividades de:

- ARQUITECTURA.
- INGENIERIA CIVIL.

SEGUNDO: Registrar igualmente que actuarán como Profesionales Idóneos Responsables de la Empresa los siguientes:

- **CARLOS A. DIAZ, CON CEDULA No. 8-172-527, ARQUITECTO, IDONEIDAD No. 92-001-015.**
- **ROBERTO E. BATISTA G., CON CEDULA No. 8-807-859, INGENIERO CIVIL, IDONEIDAD No. 2010-006-024.**

TERCERO: Que dicha empresa se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 reformada por la Ley 53 de 1963; Decreto 257 de 3 Septiembre de 1965 y demás órdenes y reglamentos que en el ejercicio legal dice la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y a comunicar a esta Junta cualquier cambio o alteración que exista en la información que aparece en su memorial solicitud.

CUARTO: Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración dentro de los 5 días hábiles a partir de su notificación.

Dado en la ciudad de Panamá el día 14 de marzo de 2023.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

ARQ. Y URB. JORGE ISAAC PEREN M.
 -Presidente



ARQ. ALFONSO PINZON L.
 Secretario

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

Panamá, 19 de abril de 2023.
Cert. -JTIA-1014-2023.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PLENO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

CERTIFICA

1. Que **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** se encuentra inscrita en esta Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá.
2. Que el ultimo registro de la empresa es mediante Resolución **0310** de **14 de marzo de 2023.**
3. Que la empresa está autorizada para ejercer obras y/o actividades de:
 - **ARQUITECTURA.**
 - **INGENIERIA CIVIL.**
4. Que los profesionales responsables de empresa son:
 - **CARLOS A. DIAZ.**
 - **ROBERTO E. BATISTA G.**
5. Que, según la verificación realizada en el departamento de Asesoría Legal de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la mencionada empresa no cuenta con sanción alguna, ni se le adelanta ningún proceso legal.

Atentamente,

ARQ. ALFONSO PINZÓN L.
SECRETARIO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



VÁLIDO POR 180 DIAS

JTIA- 64077

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 11,513

Por la cual se declara idóneo a ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO en memorial de fecha 30 de MARZO de 2010, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 12 de FEBRERO de 2010, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 8-807-859, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2010-006-024.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 5 de ABRIL de 2010.

ING. MIRIAM TEJADA DE SOLIS
PRESIDENTA

ING. HORACIO ROBLES
SECRETARIO

AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIAS

AVISO DE OPERACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación N°

17434-1-366434-2009-177259

Elizabeth Vidal Garrido Pacheco

Capital Invertido

B/.10,001.00

Expedido a favor de

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

17434-1-366434 DV27

ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A.

Yo, Elizabeth Vidal Garrido Pacheco, con cédula de identidad personal 8-208-366, con domicilio en Nuevo Chorrillo, Casa 16-01, calidad de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., con fecha de constitución 30-08-1999, esta ubicado en la provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BELLA VISTA, Urbanización BELLA VISTA, Teléfonos 2652461, Calle CALLE 45 ESTE, DIAGONAL A LA UNIVERSIDAD DE LOUSVILLE, Edificio, EDIFICIO N°8, LOCAL 2 Departamento N°2.

Declaro lo siguiente:

El establecimiento denominado ROBERTO BATISTA E HIJOS S. A., está ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMÁ, Corregimiento de BELLA VISTA, Calle CALLE 43, edificio: EDIFICIO SOUSA PLANTA BAJA, departamento: 0843-03462, Urbanización BELLA VISTA, Inicio de operaciones: 01-10-1999

Se dedicará a las actividades de:

(4220)-Construcción de proyectos de servicios públicos, (4390)-Otras actividades especializadas de la construcción, (4311)-Demolición de edificios y otras estructuras.

Cláusula de Responsabilidad: En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información por mi afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además, debe mantenerse en el establecimiento donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Ley 5 de 2007 y ley 2 de 2013.

PanamaEmprende ha avisado de la apertura del negocio a la Caja de Seguro Social y al Municipio respectivo.

Roberto Batista Reyes
C.I.P. 8-197-758
Firma del Declarante (Tramitador)

Elizabeth Vidal Garrido Pacheco
C.I.P. 8-208-366
Firma del Representante Legal de la Sociedad

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR



DECLARACIÓN DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR

Panamá, 4 de septiembre de 2023

Francisco Israel Rodríguez
Director Nacional
Dirección De Asistencia Social
Ministerio De La Presidencia
E.S.D.


Señor Francisco Israel Rodríguez:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Texto Unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la ley 153 de 8 de mayo 2020, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito **ELIZABETH GARRIDO de BATISTA**, mujer, panameña, mayor de edad, Representante Legal, casada, con cedula de identidad personal No. 8-208-366, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panamá, a Ficha: **366434**, Rollo: **17434**, Imagen: **1**, declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Que la persona que presenta la propuesta en el acto público N° 61547, para el **"MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"**, no se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas señaladas en el primer párrafo. En consecuencia, está plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto público N° 61547.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente


Elizabeth Garrido de Batista.
Cédula No. 8-208-366
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Yo, JORGE E. GANTES S, Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cedula de identidad personal No 8-509-985
CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s)

Panamá, **05 SEP 2023**

Testigos

Testigos

Ldo. Jorge E. Gantes S
Notario Público Primero

④

**CARTA DE
COMPROMISO
VERDE**




CARTA DE COMPROMISO VERDE

Panamá, 4 de septiembre de 2023

Yo, **Elizabeth Garrido de Batista**, representante Legal de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, con ruc Nº 17434-1-366434, y sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento especial de contratación del proyecto No: 61547, para **"MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"** nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestión Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2. Ejecutar actividades de sensibilización de fomento de la cultura ambiental, buenas prácticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hídrica en el país (permiso / concesiones), para la protección, conservación, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hídrico; y el manejo y tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hídrica).
4. Cumplir con las restricciones vigentes para las áreas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestión aplicables al área protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido vigentes, entre otros (En caso que aplique).
5. Garantizar la protección de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.
6. Adoptar medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, así como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.
7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el país de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e internacionales), permiso de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.
8. Cumplir con las guías de buenas prácticas ambientales de la construcción que apliquen y/o de producción más limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen, traslado, manejo y la gestión adecuada de los residuos generados.
9. Diseñar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relación a edificaciones sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislación ambiental vigente en la República de Panamá, incluyendo la Ley Nº. 40 del 2016, "Por la cual se aprueba el Acuerdo de París", el Decreto Ejecutivo Nº 393, del 14 de septiembre del 2015 "Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En búsqueda de desarrollar un proyecto que garantice la protección del ambiente y cumplimiento de las políticas ambientales.


Elizabeth Garrido de Batista
8-208-366

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Yo, **JORGE E. GANTES S.** Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cedula de identidad personal No 8-509-985

CERTIFICO:
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s)

Panamá, **05 SEP 2023**

Testigos

Testigos

Licdo. Jorge E. Gantes S
Notario Público Primero

4

Fundamento de Derecho: Artículo 25 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículos 118 al 121, del Capítulo VII del Régimen Ecológico de la Constitución Política de la República de Panamá y el Texto Único de la Ley 41 del 1 de julio de 1998 "Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.

**CARTA DE
ADHESIÓN A
PRINCIPIOS DE
SOSTENIBILIDAD**



**CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA
PROVEEDORES DEL ESTADO**

Yo, **Elizabeth Garrido Batista**, en calidad de representante legal de **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.**, con **RUC. 17434-1-366434 DV. 27** en el desempeño de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesión, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la convicción de conducirnos, en nuestra actuación profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo además, que forman parte integrante del pliego de cargos y serán de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratación.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panameño que, conozco, comprendo y me adhiero a los principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Elizabeth Garrido de Batista

C.I.P.: 8-208-366

Panamá, 4 de septiembre de 2023



Yo, **JORGE E. GANTES S.** Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cédula de identidad personal No 8-509-985
CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s)

Panamá, **05 SEP 2023**

Testigos

Testigos

Licdo. Jorge E. Gantes S
Notario Público Primero

④

PACTO DE INTEGRIDAD



PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; **FRANCISCO ISRAEL RODRIGUEZ**, panameño, portador de la cédula de identidad personal No. **7-72-332**, en su calidad de Representante Legal de la **DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL**, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una parte y por la otra, **Elizabeth Garrido de Batista**, con cedula de identidad personal No. 8-208-366, actuando en nombre y representación de la empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, sociedad debidamente inscrita al Folio **366434** y/o con Aviso de Operación No. 17434-1-366434/2009-177259, con domicilio en calle 43 Bella Vista, Edificio Sousa, planta baja, apto LL, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, el cual formara parte integral del pliego de Cargos del procedimiento de contratación Publicas del proyecto No. **61547**, celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameño y la Dirección General de Contrataciones Públicas como ente administrador del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores públicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión, confabulación, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de selección de contratista, como durante la ejecución del contrato que surja del mismo.

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la información que sobre el Acto Público No. 61547, soliciten las autoridades competentes de la República de Panamá, en materia de persecución de los delitos y/o fiscalización, regulación y control de los movimientos de los fondos y bienes públicos, así como el examen, intervención, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SÉPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representación, no podrá ser tomado en cuenta para la adjudicación en el procedimiento de selección de contratista.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobare el incumplimiento de este Pacto, durante la etapa de ejecución del contrato, será causal para la resolución administrativa de éste, sin perjuicios de las demás causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.



En el caso de los contratos de convenio Marco, será causal para la desactivación total del proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivación total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones emanadas de las órdenes de compra aprobadas previo a la desactivación, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.


OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratación, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2023.

POR LA ENTIDAD

Francisco Israel Rodríguez
Representante Legal


POR EL PROPONENTE


Elizabeth Garrido de Batista
C.I.P. No. 8-208-366
Roberto Batista e Hijos, S.A.



Fundamento de Derecho: Artículo 15 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020; Artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 10 de septiembre de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

Yo, JORGE E. GANTES S. Notario Público Primero del Circuito De Panamá, con cédula de identidad personal No 8-509-985

CERTIFICO: 
Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s)

Panamá, 05 SEP 2023

Testigos

J. Jorge E. Gantes S
Notario Público Primero



OTROS REQUISITOS

**FORMULARIO
DE
PROPUESTA**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
Proyecto No. 61547
“MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE”

FORMULARIO DE PROPUESTA.

Panamá, 7 (siete) de septiembre de 2023.

Francisco Israel Rodríguez
Representante Legal

Señor Francisco Israel Rodríguez, Director

Presentamos propuesta para el acto público No. 61547, para “MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE”

- a) Nombre de persona jurídica: ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
- b) Representante en el acto: Gabriel R. Núñez S, CIP: E-8-172252
Cuyo Poder autenticado por Notario y acta de reunión de Junta Directiva de la sociedad se adjunta.
- c) R.U.C. 17434-1-366434 y D.V. 27
- d) Domicilio: Bella Vista, calle 43, Edificio Sousa, Planta baja, Apto. LL
- e) Correo Electrónico: servicios@rbehijos.com
- f) Teléfonos: 265-2461 / 6673-9671
- g) Nuestra oferta es por un monto total de Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos dieciséis con 33/100 (B/. 154,816.33), incluido el ITBMS.

Validez de la propuesta: Ciento Veinte (120) días hábiles, contados a partir de la celebración del acto público.

Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido del pliego de Cargos.

Adjuntamos los documentos que se señalan en el siguiente cuadro los cuales corresponden a los requisitos mínimos obligatorios que deben ser objeto de evaluación por parte de la respectiva comisión.

No.	Nombre del Documento
1	Registro Publico
2	Poder de representación
3	Paz y Salvo de Renta
4	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social
5	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente
6	Declaracion Jurada de Medidas de Retorsión
7	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
8	Aviso de Operaciones
9	Incapacidad Legal Para Contratar
10	Carta de Compromiso Verde
11	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad

12	Pacto de Integridad
13	Formulario de Propuesta
14	Desglose de Precios
15	Documento de Identidad Personal
16	Inscripción en el Registro de Proponentes
17	Experiencia del Proponente
18	Personal Técnico de la Empresa
19	Carta de Referencia Financiera
20	Carta de Intención de Financiamiento
21	Cronograma de Ejecución
22	Ampyme



Elizabeth Garrido de Batista

8-208-366

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

**PLAN DE
PROPUESTA
DEL
PROYECTO**

FORMULARIO N°. 2

DESGLOSE DE PRECIOS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION: 61547 "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"

COMPAÑÍA PROPONENTE:ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO:ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA / GABRIEL NUÑEZ

RUC DE LA COMPAÑÍA: 17434-1-366434 DV 27

TELEFONO: 6673-9671

FAX: _____

E-MAIL:SERVICIOS@RBEHIJOS.COM

VERAGUAS,-"MEJORAS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"

Act	descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo Total
PRELIMINAR					
070752	LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00	B/.1,500.00	B/. 1,500.00
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA,1 LOGO GRAV. AZUL	CU	1.00	B/.1,500.00	B/. 1,500.00
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00	B/.1,500.00	B/. 1,500.00
11 18	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 M	CU	1.00	B/.3,000.00	B/. 3,000.00
010708	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES	PLANTA	10.00	B/.100.00	B/. 1,000.00
68 15	NIVELACION DE AREA DE URGENCIA	M2	72.47	B/.20.00	B/. 1,449.40
010901	REPLANTEO Y DEMARCAACION	ML	16.18	B/.120.00	B/. 1,941.60

DEMOLICION					
010225	DEMOLICION DE AREA ABIERTA DE COVID,INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	47.76	B/.50.00	B/. 2,388.00

CONSTRUCCION DEL AREA DE URGENCIAS					
212149	CEMENTO CORRIDO, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG, C/R	M3	1.32	B/.500.00	B/. 660.00
2 3 6	BLOQUE DE 6", RELLENOS	M2	20.75	B/.70.00	B/. 1,452.50
020210	ZAPATAS DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	M3	3.03	B/.500.00	B/. 1,515.00
020303	PEDESTAL AL CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	M3	0.54	B/.500.00	B/. 270.00
212127	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M. CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	M3	4.97	B/.500.00	B/. 2,485.00
020610	COLUMNAS DE 0.15 X 0.30M CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG C/R	M3	1.68	B/.500.00	B/. 840.00
2 5 7	VIGAS DE 0.15 X 0.30 M. CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R 4 # 5, EST. # 3	M3	2.61	B/.500.00	B/. 1,305.00
2 4104	VIGA DE AMARRE DE CONCRETO DE 3,000 CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. 2 # 5, EST. # 3	M3	0.45	B/.500.00	B/. 225.00
4 6363	TECHO COMPLETO (LAMINA DE DE ZINC GALVANIZADAS DE 2" x 4", CAL. 16, ALINEADORES DE 1/2", CABALLETE LISO DE 24"	M2	100.79	B/.70.00	B/. 7,055.30
4 6 60	FASCIA PERIMETRAL, (CARRIOLA DE METAL 2" X 6". CAL.16)	ML	40.22	B/.50.00	B/. 2,011.00
6 6 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	97.11	B/.50.00	B/. 4,855.50
6 4 1	COLOCACION DE VENTANAS (VIDRIO, MARCO DE ACERO INOXIDABLE), COMPLETAS	M2	1.68	B/.160.00	B/. 268.80
6 6206	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEJAS DE HIERRO DE 1" X 1" X 1/8", COMPLETA	M2	1.86	B/.100.00	B/. 186.00
6 2370	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.15 M, ANTIPANICO CON VIDRIO, COMPLETA	CU	2.00	B/.1,500.00	B/. 3,000.00
030110	PARED DE BLOQUE DE 4" CEMENTO	M2	40.06	B/.50.00	B/. 2,003.00
030202	REPELLO LISO DE 1.50 CM DE ESPESOR	M2	84.76	B/.30.00	B/. 2,542.80
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	84.76	B/.15.00	B/. 1,271.40
212242	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP. =0.10 M, COMPLETO	M2	55.39	B/.50.00	B/. 2,769.50
5 4 88	PISO PARA RAMPA, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R, 4 # 5 EN A/D,EST. # 3	M2	14.38	B/.50.00	B/. 719.00
4 52 57	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE TUBOS DE 2" GALV. VERTICAL /HORIZONTAL, AREA DE URGENCIA - INYECTABLES/INHALOTERAPIA), AMBOS LADOS	ML	13.64	B/.60.00	B/. 818.40

Roberto Batista

9 4 68	COLOCACION DE BALDOSAS COMPLETAS	M2	30.71	B/.60.00	B/.	1,842.60
9 1 57	ZOCALO PARA BALDOSAS, COMPLETO	ML	24.91	B/.20.00	B/.	498.20
5 4 1	CONSTRUCCION DE ACERAS, E = 0.10 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R URGENCIA E INHALOTERAPIA), COMPLETAS	M2	10.66	B/.50.00	B/.	533.00
3 3 457	CONSTRUCCION DE CANAL DE 0.10 X 0.30 M, CON PARRILLA COMPLETA	ML	9.63	B/.50.00	B/.	481.50
3 2 3	DIVISION PLEGABLE DE 1.80 X 6.50 M	CU	1.00	B/.400.00	B/.	400.00
7 1 84	SUMINISTYRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	2.00	B/.500.00	B/.	1,000.00
7 1 82	SUMINISTYRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
110 17	DESMONTE DE PUERTA DE 1.40 X 2.00 M, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.200.00	B/.	200.00
110 38	DESMONTAR MUEBLE SOBRE EL LAVAMANO DE 0.60 X 2.60 INCLUYE : ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	CU	1.00	B/.200.00	B/.	200.00

MEJORAS AREA DE INYECTABLES/INHALOTERAPIA						
1 1238	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	24.72	B/.20.00	B/.	494.40
6 6 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA	M2	24.72	B/.50.00	B/.	1,236.00
3 2121	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8),COMPLETO	M2	10.80	B/.60.00	B/.	648.00
030110	PARED DE BLOQUE DE 4", CEMENTO	M2	1.50	B/.45.00	B/.	67.50
30202	REPELLO LISO DE 1.50 CM DE ESPESOR	M2	3.00	B/.30.00	B/.	90.00
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	24.60	B/.12.00	B/.	295.20
6 1214	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
7 1 84	SUMINISTYRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
7 1 82	SUMINISTYRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00

MEJORAS AREA DE ODONTOLOGIA						
110 14	DEMOLICION DE PARED, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	5.01	B/.20.00	B/.	100.20
11092	DEMOLICION DE MUEBLE DE MADERA DE 1.10 X 2.81 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	3.09	B/.200.00	B/.	618.00
1 1238	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	19.28	B/.20.00	B/.	385.60
6 6 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	19.28	B/.50.00	B/.	964.00
3 2121	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8),COMPLETO	M2	5.98	B/.60.00	B/.	358.80
9118	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	M2	39.08	B/.12.00	B/.	468.96
6 1214	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
7184	SUMINISTYRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
9457	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS COMPLETO	CU	2.54	B/.50.00	B/.	127.00
7182	SUMINISTYRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.80 M, COMPLETO	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00
40438	SALIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" O PVC	CU	2.00	B/.100.00	B/.	200.00
727308	SALIDA DE AGUAS NEGRAS DE 4" O PVC	CU	2.00	B/.100.00	B/.	200.00

AREA EXTERNA						
9210	LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO, COMPLETO	M3	44.77	B/.100.00	B/.	4,477.00
80109	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS DE 3/4" DE PVC, DE ODONTOLOGIA A BAÑOS	ML	9.00	B/.50.00	B/.	450.00
4016	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS DE 4" PVC, DE ODONTOLOGIA A BAÑOS	ML	9.00	B/.80.00	B/.	720.00
2410	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.80 X 0.80 M. COMPLETA	CU	1.00	B/.500.00	B/.	500.00

EQUIPAMIENTO						
--------------	--	--	--	--	--	--

5014353	EQUIPO DENTAL COMPLETO CON UNIDAD ADOSADA AL SILLON (ELECTROHIDRAULICO BASE GIRATORIA), FICHA TECNICA 71290	CU	2.00	B/.7,500.00	B/. 15,000.00
8250	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACODICIONADO SPLIT12,000 BTU, COMPLETO	CU	4.00	B/.1,200.00	B/. 4,800.00
81621	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU, COMPLETO	CU	1.00	B/.2,000.00	B/. 2,000.00
11127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE DE MESA AUTOMATICO ENTRE 21.5 Y 28 LITROS, FICHA TECNICA 70905	CU	2	B/.14,000.00	B/. 28,000.00
8145	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INALAMBRICA TIPO LED PARA POLIMERACION DE MATERIALES FOTOCURABLES, FICHA TECNICA 105441	CU	2	B/.400.00	B/. 800.00
5010113	TABURETE METALICO GIRATORIO	CU	2.00	B/.200.00	B/. 400.00

INYECTABLE/INHALOTERAPIA					
5014290	SUMINISTRO DE CAMILLA	CU	1.00	B/.2,000.00	B/. 2,000.00
50144	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	CU	1.00	B/.200.00	B/. 200.00
501099	SUMINISTRO DE SILLONES PARA INHALOTERAPIA	CU	2.00	B/.600.00	B/. 1,200.00
501041	SUMINISTRO DE SILLA TIPO SECRETARIA	CU	1.00	B/.250.00	B/. 250.00

Act	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo Total
501442	SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE METAL	CU	1.00	B/.500.00	B/. 500.00

URGENCIAS					
5014290	SUMINISTRO DE CAMILLA	CU	2.00	B/.2,000.00	B/. 4,000.00
50144	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	CU	2.00	B/.200.00	B/. 400.00

ELECTRICIDAD					
30101	CONSTRUCCION DE TAPIA CON RECEPTACULO DE MEDIDOR NEMA 3R, PANEL DE 12 CIRCUITOS CON IP 60 AMP.,2P BARRA DE GROUND CON REGISTRO DE INSPECCION, PUNTO DE ENTRADA,CABLEADO, ACCESORIOS,COMPLETA	CU	1.00	B/.1,000.00	B/. 1,000.00
8138	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS MONOFASICOS DE 120/240 V, BARRAS DE 200 AMP., BREAKER, CABLEADO, ACCESORIO, COMPLETO	CU	1.00	B/.1,000.00	B/. 1,000.00
82109	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED RECTANGULARES, IP67, 100 W, CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, BREAKERS, ACCESORIOS, COMPLETAS	CU	5.00	B/.200.00	B/. 1,000.00
81158	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE TECHO EMPOTRADAS REDONDAS, IP40, IMPERMEABLES DE 15 W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS, COMPLETAS	CU	28.00	B/.200.00	B/. 5,600.00
86284	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 110 V CON CAJA 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	2.00	B/.100.00	B/. 200.00
8569	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220 V PARA AIRE ACONDICIONADO, CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	CU	5.00	B/.150.00	B/. 750.00
86643	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 LASOS, 120 V CON ACCESORIOS, INCLUYE: DETECTORES, ESTACIONES, COMPLETO	CU	1.00	B/.1,000.00	B/. 1,000.00
93357	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO LUMINISCENTES, COMPLETO	CU	6.00	B/.500.00	B/. 3,000.00
SUB-TOTAL					B/. 144,688.16
ITBMS					B/. 10,128.17
TOTAL					B/. 154,816.33

NOTA:


1. El contratista deberá incluir en su propuesta el pago del impuesto municipal de construcción. El renglón ITBMS solo será llenado por personas naturales o jurídicas establecidas en la ley 61 de diciembre de 2002

2. El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades mínimas para que el proponente presente su oferta. llevar un control de la obra. En ningún momento este documento tiene como implicación que el contrato suscrito por la empresa adjudicataria, es un contrato por precio unitario, por lo que la DAS exigirá la completa ejecución de la obra en base a los planos, términos de referencia y especificaciones técnicas suministradas.

4. El contratista deberá incluir en el Plan de Propuesta del Proyecto cualquier actividad que considere necesaria al momento de hacer su propuesta. De darse la contratación deberá cumplir con la totalidad de las actividades descritas en el listado, así como con cualquier otra actividad presente en el plano que haya omitido en su propuesta.

TIEMPO DE EJECUCION: 180 DÍAS CALENDARIO
REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
RUC DE LA COMPANIA: 17434-1-366434 DV 27

FIRMA: 

Roberto E. Batista: 
CIP: 8-807-859
IDONEIDAD: 2010-006-024

**DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
PERSONAL**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL


Elizabeth Vidal
Garrido Pacheco de Batista

Nombre Oficial
Fecha de nacimiento: 20-SEP-1983
Lugar de nacimiento: PANAMA, PANAMA
Sexo: F. DONANTE TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 04-ABR-2014 EXPIRA: 04-ABR-2024


8-208-366



TE TRIBUNAL ELECTORAL



8-208-366



N103FFDX01KVCW

REPÚBLICA DE PANAMÁ

CARNE DE RESIDENTE PERMANENTE

**Gabriel Rafael
Nuñez Santana**



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 08-SEP-1989
LUGAR DE NACIMIENTO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 23-MAY-2019 EXPIRA: 23-MAY-2029

E-8-172252



Gabriel R. Nuñez S

**INSCRIPCIÓN
EN EL
REGISTRO DE
PROPONENTE**

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social (DAS)

Certificado de Oferente

(ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.)

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener:

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE OFERENTES

Fecha de Emisión: **lunes, 6 de marzo de 2023**

Fecha de Validez: **miércoles, 6 de septiembre de 2023**



DORIS ESPINO RODRIGUEZ
Jefa de Contrataciones, a.l de la DAS

Los proponentes deberán actualizar los datos relativos a su inscripción, cuando mínimo cada seis (6) meses.

Fundamento de Derecho: Decreto Ejecutivo N°.608 de 2 de octubre de 2020 "Que aprueba el Reglamento Especial para La Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Beneficio Social. Por Intermedio de la Dirección de Asistencia Social (DAS), y se Reforma el Decreto Ejecutivo N°. 775 de 12 de noviembre de 2015".

**EXPERIENCIA
DEL
PROPONENTE**



Republica de Panamá
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ACTA DE ACEPTACION FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2005, que regula la contratación pública.

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

CONTRATO: N° OAL - 032 - ADM - 15

PROYECTO: Suministro, transporte de materiales de construcción, para la rehabilitación de la Dirección Regional de Servicios Agropecuarios N° 10 Darién, La Palma; dormitorios y la construcción de depósito y estructura de techos para botes.

UBICACIÓN: La Palma, Distrito de Chepigana, provincia de Darién.

ASEGURADORA: Aseguradora del Istmo.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° FICC-5450

FECHA DE ENDOSO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 23 de junio de 2016

Valor Original del Contrato: B/184,020.45

Adiciones al Valor Original: B/0.00

Disminuciones al valor original: B/0.00

Valor Final del Contrato: B/184,020.45

Retraso en la Entrega: 43 días

Multa por Atraso en la Entrega: B/132.87


Orden de Proceder 11 de enero de 2016

Duración contractual original 120 días

Vencimiento de Contrato 9 de mayo de 2016

Nueva fecha de vencimiento: 21 de junio de 2016.

Duración contractual final: 163 días calendario



Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargo y del resto de los documentos contemplados contractualmente, El MIDA a través de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 21 del mes de junio de 2016

[Firma manuscrita]
 Firma del representante de la Entidad
 Responsabilidad Técnica Exclusiva

[Firma manuscrita]
 Firma del Contratista
 Ejecutor

Nombre: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.

Nombre: Roberto Batista E. R.

Cédula: 8-157-1593

Cédula: 8-157-758

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de República, considera como viable los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra que ha establecido y aceptado el M.I.D.A. actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Firma manuscrita]
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República

Nombre: Mercedes Cáceres M.

Cédula: 5-21-5

Ing. Mercedes Cáceres M.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General - Darién

5/8/16

AF: 003/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERIA DE VERAGUAS

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, acápite 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de obra, de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006)

CONTRATISTA: **CONSORCIO HALFESA BATISTA**

CONTRATO: **O-43-2017**

PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO DE EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÁBE BUGLE, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**

UBICACIÓN: **Corregimiento del Paredón, Distrito de Ñurum, Comarca Ngábe Bugle, Región Kodriri, República de Panamá**

ASEGURADORA: **ACERTA SEGUROS, S.A.**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: **N° 04-1004068-0**

VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO: **B/. 4,245,907.38**

ADICIONES AL VALOR ORIGINAL: **NINGUNA**

DISMINUCIONES AL VALOR ORIGINAL: **NINGUNA**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: **B/. 4,245,907.38**

MULTA: **NO APLICA**

Orden de Proceder: **8 ENERO 2018** Duración contractual original: **650 DÍAS CALENDARIO**

Vencimiento del Contrato: **19 DE OCTUBRE 2019** Prórroga bajo Adenda N° 1: **121 DÍAS CALENDARIO**


Nueva fecha de vencimiento: **17 DE FEBRERO 2020** Prórroga bajo Adenda N° 2: **365 DÍAS CALENDARIO**


Nueva fecha de vencimiento: **16 DE FEBRERO 2021** Duración contractual Final: **1,136 DÍAS CALENDARIO**

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra referida: **el día 16 de febrero de 2021**.


OBSERVACIONES: **El Acta de Aceptación Final se firma hoy, 10 de marzo de 2021, ya que el referendo de Adenda por Extensión de Tiempo N°2 el cual dependía de la Contraloría General de la República de Panamá, se dio el 09 de marzo de 2021.**

Se formaliza esta Acta de Aceptación Final toda vez que la empresa Contratista cumplió a cabalidad con el tiempo estipulado dentro del Contrato, las especificaciones técnicas establecidas en el mismo y con la calidad de materiales y mano de obra establecida dentro del Pliego de Cargos.


Firma del representante de la Entidad ME/DUCA
Nombre: **ARQ. KAROL A. CERRUD V.**
C.I. 2015-00-103
Cédula: 9-707-1545


Firma del Representante Legal
Nombre: **EMELDA GONZALEZ**
Cédula: 7-68-104

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido el Ministerio de Educación actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes por el Estado y sus beneficiarios.


Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General de la República de Panamá
Nombre: **ING. JORGE COGLEY**
Cédula:

Ing. Jorge M. Cogley A.
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Veraguas

GOBIERNO NACIONAL

REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

Declaración de Terminación de Obra Contemplado según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y en el Capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87 Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley Nº22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA	ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.		
CONTRATO	030-2012/PROSI		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE DAVID		
UBICACION	PROVINCIA DE CHIRIQUÍ	DISTRITO DE DAVID	CORREGIMIENTO DE DAVID
SEGURADORA	DEL ISTMO ASSURANCE CORP.		
ANZA DE CUMPLIMIENTO	FICC-2681		
ANZA DE PAGO	N/A		
CLAS	N/A		
ANZA DE PAGO ANTICIPADO (15%)	FICC-2682		

Valor Original del Contrato	B/. 717,841.71
Reducciones al Valor Original	B/. 310,875.36 <i>Adenda N°1</i>
Aumentaciones al Valor Original	B/. 0.00
Valor Final del Contrato	B/. 1,028,717.07

Fecha de Proceder	08-01-2013	Duración Contractual Original:	210 DÍAS CALENDARIO
Inicio del Contrato	05-08-2013	Prórroga de Adenda N°1:	179 DÍAS CALENDARIO
Fecha de Vencimiento	31-01-2014	Duración Contractual Final:	389 DÍAS CALENDARIO


Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente el día 31 del mes de enero de 2014.


OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
CONSULTOR/PROSI
Arq. Xavler Grenald M.
Cédula: 3-712-561


OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
CONSULTOR/PROSI
Ing. Alberto González G.
Cédula: 6-71-201


CONTRATISTA
ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.
Roberto Batista R.
Cédula: 8-197-758

La Dirección Nacional de Ingeniería considera como viables los criterios, procesos, documentación y resultados físicos primordiales de aceptación final que ha establecido la Entidad Contratante (o Unidad Gestora) actuante como dueño de la obra y finiquita los procesos de fiscalización que facultan la transferencia y el usufructo de la totalidad de estos bienes al Estado y sus beneficiarios.

Arq. Pedro Ortiz 
Fiscalizador de Obras
Dirección Nacional de Ingeniería
Contraloría General - Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Arq. Pedro Ortiz
Cédula: 4-118-2376

OBS: Proy. con Adenda #1 y % cambios 



República de Panamá
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL

(Declaración de Terminación de Obra Contemplada según el Capítulo I de las Disposiciones Generales, Artículo 2, Glosario, numeral 46 y el capítulo 10, Contrato de Obra, Artículo 87: Terminación de la Obra del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública)

CONTRATISTA: ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.
 CONTRATO: DPC-229-2010
 PROYECTO: Construcción de Edificio para Cafetería Central, Campus Dr. Victor Levi Sasso
 UBICACION: Campus Victor Levi Sasso, Vía Universidad Tecnológica de Panamá, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, República de Panamá.
 ASEGURADORA: Del Istmo Assurance Corp.
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: FC-005480-0
 FIANZA DE PAGO: FC-005481-0
 POLIZAS No. 01-02-820 (Assicurazioni Generali S.A.)

Valor Original del Contrato: B/. 1,062,776.00
 Adiciones al Valor Original: B/. 177,884.83
 Disminuciones al Valor Original: B/. 31,249.39
 Valor Final del Contrato: B/. 1,209,411.44

Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2010 Duración Contractual Original: 210 días calendario
 Vencimiento del Contrato: 17 de julio de 2011 Prorroga bajo adenda N°1: 118 días calendario
 Vencimiento del Contrato: 12 de noviembre de 2011 Prorroga bajo adenda N°2: 181 días calendario
 Vencimiento del Contrato: 11 de mayo de 2012 Prorroga bajo adenda N°3: 112 días calendario
 Nueva fecha de Vencimiento del Contrato: 31 de agosto de 2012

Mediante esta síntesis técnica, y posterior a los procesos de verificación efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del Pliego de Cargos y del resto de los documentos contemplados contractualmente, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ recibe la obra objeto del presente contrato consignando la firma correspondiente para establecer la fecha oficial de terminación de la obra correspondiente: el día 16 de noviembre de 2012.

Maria E. Castillo B.

Inspección
 Universidad Tecnológica de Panamá
 ING. MARÍA E. CASTILLO
 Cédula: 9-721-970

[Firma]

Contratista
 Roberto Batista e Hijos S.A.
 SR. ROBERTO BATISTA
 Cédula: 8-177-208

[Firma]

Roberto Batista e Hijos S.A.
 ARQ. CARLOS DIAZ
 Cédula: 8-172-527

[Firma]

Roberto Batista e Hijos S.A.
 ARQ. TAMARA PONCE
 Cédula: 8-461-401

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República considera como viables los criterios, y resultados físicos primordiales de aceptación final de la obra, que ha establecido y aceptado la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ actuante como dueño de la obra y da por concluida la etapa de fiscalización de la ejecución física de la obra.

[Firma]
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General de la República

10/07/2012
 Arq. Vicente García M.
 Fiscalizador de Obras
 Dirección Nacional de Ingeniería
 Contraloría General

Nombre: Vicente García
 Cédula: _____

Observación: El Sub-Total dejado a ejecutar al 31 de agosto de 2012 fue de B/.127,901.16 el cual se usó para calcular la multa correspondiente, el 4% de B/.127,901.16 entre 30 da un valor de B/.170.54 por cada día de atraso, la fecha oficial de terminación de la obra fue el día 16 de noviembre de 2012, lo que da 77 días de atraso, al multiplicarlo nos da B/.12,790.12, sin ITBMS.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
 SECRETARÍA GENERAL
 ES ESTE COPIA DEL ORIGINAL
[Firma]
 SECRETARÍA GENERAL

**PERSONAL
TECNICO DE LA
EMPRESA**

ORGANIZACION – PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO

Panama, 7 de september de 2023.

Señor
Francisco Israel Rodriguez


Direccion de Asistencia Social
Ciudad

Ref. Acto Publico No.: 61547 "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"

Estimado Señor:

Yo, Elizabeth Garrido de Batista, portador de la cedula de indentidad personal N: 8-208-366, en condición de representante legal de ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A., por este medio y de manera formal, manifiesto que la empresa cuenta con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del acto público indicado en la referencia, además cuenta con el personal técnico idóneo necesario para ejecutar satisfactoriamente y en el plazo requerido el proyecto. El personal técnico mínimo que presentamos atendiendo a lo solicitado en el Pliego de Cargos está integrado de la siguiente manera:

Nombre	Cédula	Cargo	Idoneidad
Roberto E. Batisa	8-807-859	Ingeniero Civil	2010-006-024
Samuel García Brown	8-815-1627	Ingeniero Electromecanico	2016-024-014
Luis Alberto Alavarca	4-714-205	Técnico en Edificaciones	


Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista
CIP: 8-208-366

Roberto E. Batista G.

Cédula: 8-807-859

Fecha de Nacimiento: 4 de Julio de 1987

Dirección: Panamá, Distrito de Arraijan, Panama Pacifico, Woodlands, Casa 342

Teléfono: (507) 259-7350

Teléfono 2: (507) 344-9006

Celular: (507) 6673-9658

Formación Académica

Mayo 2015—Universidad de Louisville

Diplomado del Project Management Institute

Mayo 2012—Universidad Tecnológica de Panamá

Master en Administración de Proyectos de Construcción

Febrero 2010—Universidad Tecnológica de Panamá

Licenciatura en Ingeniería Civil

Diciembre 2004—Colegio Javier

Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía

Experiencia en Diseño Estructural y Sistema Sanitario:

- ◆ Diseño Estructural de Pabellon de tres aulas y cancha techada en Proyecto 11 de Octubre, Meduca (2018)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Galera de 1500 m2 para oficinas y depositos en Juan Diaz, Inmobiliaria Don Jose (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Pabellon de dos altos y modulo de banos en Colegio San Gabriel de la Dolorosa, Arraijan (2017)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario Del Rain Shelter (banos para cancha de golf), Santa Maria Golf & Country Club (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Escuela de bellas artes, banos y salon de danza en chorrera, Inac (2016)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de Oficinas, modulo de banos y sala de conferencias del corredor Biologico en Curundu, Anam (2015)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de taller de soldadura en Inadeh Changuinola (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Sala de conferencias, oficinas administrativas, Puente peatonal Inadeh Chiriqui Grande(2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de 2 aulas de interclase y 2 salones de internet, Inadeh David (2013)

C. Vitae: Roberto E. Batista G.

- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2013)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Canal cerrado y desague de aulas pluviales, Inadeh Chitre(2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de albergue para capacitacion, Inadeh Las lajas (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Pluvial de Galera para Lumbricultura y Pozo de Agua, Inadeh Guarare (2012)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de taller de cocina en Inadeh de Santiago (2011)
- ◆ Diseño Estructural y Sanitario de las oficinas del Sistema de estadísticas criminales en Albrook, Ministerio de Seguridad (2011)

Enero 2019– Actualidad – Construlab S.A. Director Tecnico.

- ◆ Elaboracion y Revision Final de propuestas para Proyectos.
- ◆ Revision de diseños.
- ◆ Control y Negociacion de costos en Proyectos.
- ◆ Seguimiento del cronograma de ejecucion de Proyectos.

Julio 2012– Diciembre 2018 – Empresas RB Gerente de Proyectos.

- ◆ Elaboracion de propuestas para Proyectos.
- ◆ Coordinación con personal Tecnico de proyectos, para la correcta ejecución de Proyectos.
- ◆ Manejo y control de tiempos de ejecucion de Proyectos.
- ◆ Ejecucion directa de Proyectos.
- ◆ Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de construcción y diseño.

C. Vitae: Roberto E. Batista G.

**Enero 2011 – Junio 2012– Empresas RB
División de Proyectos de Construcción
Ingeniero de Proyectos**

- ♦ **Elaboración de Presupuestos.**
- ♦ **Diseño Estructural y Confección de Planos.**
- ♦ **Inspeccion de Proyectos.**

- Proyecto Diseño y Construcción de Mejoras a las oficinas del Sistema de Estadísticas Criminales, Albrook, Ciudad de Panamá.
- Proyecto Construcción de Fachada del Edificio Principal y Estacionamientos del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Oeste.
- Proyecto Construcción de Edificio para la Cafeteria Central de la Universidad Tecnologia.
- Proyecto Construcción de Edificaciones para Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de 5km de Pavimentos en Proyecto Santa Maria Golf & Country Club Panama.
- Proyecto Construcción de Auditorio para la Escuela de Bellas Artes del INAC.

**Mayo 2010– Diciembre 2010– Contratistas Generales y Eléctricos, S.A.
Departamento de Proyectos de Construcción
Asistente de Ingeniero Civil**

- ♦ Inspector de Proyecto Residencia Muñoz, Las Cumbres, Ciudad de Panamá

**Enero 2009– Abril 2010– Ingeniería RM
Proyecto Edificio Ten Tower**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Residente**
- Calculo de Materiales
- Inspección de obras
- Confección de Informes de Control de Calidad

**Agosto 2007– Diciembre 2008– Empresas RB
División de Proyectos de Construcción**

- ♦ **Asistente de Ingeniero Civil**

Idiomas

- ♦ Español. (Nativo)
- ♦ Ingles (Intermedio- Avanzado)

Conocimientos.

- ♦ Microsoft Office (Project, Excell, y demas programas basicos)
- ♦ AutoCAD
- ♦ SAP2000

Licencias

- ♦ Licencia de conducir Tipo C.
- ♦ Licencia de Ingeniero Civil No. 2010-006-024

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 7 de septiembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Roberto E. Batista, con cedula de identidad personal: 8-807-859, panameño, Ingeniero civil, con idoneidad: 2010-006-024, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61547** para el proyecto No. **"MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"** asumiremos la responsabilidad como ingeniero Civil.

Atentamente



Roberto E. Batista
CIP: 8-807-859
Ingeniero Civil



Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista
CIP: 8-208-366

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Roberto Estefano
Batista Garrido**



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 04-JUL-1987
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M DURANTE TIPO DE SANGRE:
EXPIRACIÓN: 19-FEB-2018 EXPIRA: 19-FEB-2028

8-807-859



TELEFONIA

MAPA GENERAL DE SERVIDOR



8-807-2018

AT08080715

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 del 26 de Enero de 1959)

RESOLUCIÓN N° 11,513

Por la cual se declara idóneo a ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONSIDERANDO:

Que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO en memorial de fecha 30 de MARZO de 2010, solicitó a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le declare idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República.

Que en cumplimiento con lo que establece el artículo 5° de la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO acompaña a su solicitud:

- a) Certificado de Nacimiento, expedido por el Director del Registro Civil, para acreditar su calidad de panameño.
- b) Original del Diploma otorgado por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA el día 12 de FEBRERO de 2010, para comprobar que tiene el título de LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, y que está debidamente inscrito en el Ministerio de Educación.

RESUELVE:

Declarar, como en efecto declara, que ROBERTO ESTEFANO BATISTA GARRIDO, mayor de edad, de nacionalidad PANAMEÑA, portador de la cédula de identidad personal N° 8-807-859, es idóneo para ejercer la profesión de INGENIERO CIVIL en el territorio de la República, y por lo tanto, al tenor de lo que establece la Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformada por la Ley 53 de 1963, se le extiende el Certificado de Idoneidad correspondiente al número:

C.I. No.: 2010-006-024.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 5 de ABRIL de 2010.

ING. MIRIAM TEJADA DE SOLÍS
PRESIDENTA

ING. HORACIO ROBLES
SECRETARIO



**LA SOCIEDAD PANAMEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS**



Confiere Certificado #SRTE-2648

ROBERTO BATISTA

C.I.P. 8-807-859 C.I.N. 2010-006-024

Por su participación en el Seminario Dirigido a Profesionales Idóneos Responsables Técnicos de Empresas dedicadas a las ramas de Ingeniería y Arquitectura; según lo dispuesto por la Resolución N° 137 de 13 de agosto de 2014, publicado en la gaceta No. 27626-A, del 22 de septiembre del 2014.

Realizado en la Ciudad de Panamá el 7 de febrero de 2019.

Ing. Angela Laguna Caicedo.
Presidente SPIA-JTIA

Arq. Jorge Pitalúa
Secretario General SPIA

355 02



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



ROBERTO ESTEFANO BATISTA G.
Ced.: 8-807-859
INGENIERO CIVIL
C.I.N° 2010-006-024

[Signature] *[Signature]*
Presidente Secretario

355



190227034251 02

"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."

Carnet emitido el día: 02-ene-2019
Carnet expira el día: 02-ene-2024
PIN: sTlqk-pCvle-QriDR



SAMUEL GARCÍA BROWN

Ing. Electromecánico – Idóneo en República de Panamá

✉ sam.garcia.b@gmail.com

☎ (507) 6152-4453

 <https://www.linkedin.com/in/samuelgarciab/>

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Ingeniería Eléctrica con especialización en Electrónica de Potencia (2012 - 2014)

Universidad de Arkansas, EE.UU.

Ingeniería Electromecánica (2010)

Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá

Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía (2004)

Colegio Javier, Panamá

EXPERIENCIA LABORAL

Profesional Independiente

Ciudad de Panamá (Jun 2021- actualidad)

Gestión de actividades del área de ingeniería eléctrica a nivel residencial, comercial e industrial en las siguientes áreas:

- Diseño y revisión de instalaciones eléctricas de acuerdo con norma NFPA 70 (NEC: National Electrical Code)
- Consultoría eléctrica en sistemas de monitoreo (equipos y software) de eficiencia energética y calidad de energía
- Administrador de proyectos, incluyendo planificación, seguimiento y culminación.

BTU Energía, S.A.

Ciudad de Panamá (Jun 2023- actualidad)

Líder, Departamento Digital Energy

Responsable de gestión del departamento de Digital Energy, que involucra:

- Seguimiento y desarrollo de la cartera de productos y soluciones del departamento: software de gestión de energía y calidad de energía, equipos de medición de energía y calidad de energía, relevadores de potencia, bancos de capacitores, filtros activos, SCADAs eléctricos.
- Formulación y seguimiento de proyectos en el área comercial, industrial y de distribución, transmisión y generación eléctrica.
- Responsable de un equipo de ingenieros para la gestión de proyectos.

Haleon

Ciudad de Panamá (Feb 2022- Jun 2023, 1 año)

Ingeniero de Proyectos

Encargado de gestión de múltiples proyectos simultáneamente de la planta de Haleon que incluye:

- Formulación de proyectos a partir de necesidades internas de la planta o en mejora de procesos
- Gestión de proyectos de distintas disciplinas como mecánicas, eléctricas y estructurales
- Ejecución de proyectos cumpliendo los protocolos farmacéuticos de calidad de calificación de diseño (DQ), comisionamiento, calificación de instalación (IQ), calificación de operación (OQ) y calificación de desempeño (PQ).
- Gestión de proyectos a través de todas sus fases: planificación, contratación de personal contratista, seguimiento técnico de alcance y presupuesto, culminación y puesta en marcha

CFS Energía, S.A.

Ciudad de Panamá (Ago 2019- Jun 2021, 2 años)

Asesor Comercial

Encargado de prospección, negociación y obtención de oportunidades en el área energía eléctrica a nivel comercial e industrial.

- Prospección de mercado y clientes potenciales mediante definición de planes estratégicos de atención

- Consultoría, asesoramiento técnico-económico (ventas consultivas) a clientes para la definición y búsqueda de áreas de mejora en sus distintas actividades mediante la implementación requerida y adecuada de soluciones, mantenimientos y equipos especializados.
- Revisión y elaboración de presupuestos de propuestas de venta de suministros, proyectos y mantenimientos.
- Negociación de ventas y seguimiento de atención postventa.

BTU Energía, S.A.

Ciudad de Panamá (Ago 2014- Ago 2019, 5 años)

Ingeniero de Proyectos

Responsable de gestión proyectos a nivel comercial e industrial de sistemas de automatización y control y de sistemas de medición de energía y calidad de energía.

- Relación con cliente final, levantamiento en campo de información de requerimientos de proyectos, formulación de propuestas técnico-comerciales, diseño eléctrico y de control de la solución propuesta, cotización de equipos y materiales, configuración de equipos y supervisión de pruebas FAT, supervisión de instalación en campo, ejecución de puesta en marcha y comisionamiento, redacción de informes técnicos y capacitación técnica al cliente.
- Configuración y programación de softwares y equipos como controladores lógico programables (PLC), pantallas de interfaz humana (HMI), medidores y analizadores de calidad de energía eléctrica, sistemas SCADA, sistemas de gestión de energía y calidad de energía.
- Diseño y revisión de instalaciones eléctricas de acuerdo con norma NFPA 70 (NEC: National Electrical Code).

Gas Natural Fenosa (Naturgy)

Ciudad de Panamá (2010-2012, 2 años)

Supervisor Departamento de Calidad de Suministro

Encargado del monitoreo de las Normas de Calidad del Servicio Técnico de los clientes de la red de distribución de energía eléctrica, tales como índices de confiabilidad (SAIFI y SAIDI), niveles de tensión (variaciones e interrupciones), flicker y armónicos.

- Elaboración y revisión (diaria, semanal, mensual, semestral y anual) de informes técnicos y estadísticos sobre reportes de quejas y fallas eléctricas en la red de distribución, así como también de informes técnicos de calidad de energía eléctrica con base en las normas de calidad locales.
- Planeamiento y seguimiento de instalaciones de analizadores de calidad de energía eléctrica en suministros de baja y media tensión para el monitoreo de niveles de tensión, flicker y armónicos
- Administración de contratos con subcontratistas para la medición y análisis de la calidad de energía eléctrica de los clientes de la red de distribución.
- Colaboración en distintas actividades administrativas con departamentos Legal, Financiero, Operaciones, Mantenimiento y Atención al Cliente.

Universidad Tecnológica de Panamá

Ciudad de Panamá (2008-2010, 2 años)

Asistente de Laboratorio

(Abr 2008 – Dic 2009)

Impartición de materias en la Facultad de Ingeniería Eléctrica: Elementos de Electricidad, Sistemas Eléctricos, Circuitos I, Circuitos III y Conversión de Energía II.

Asistente de Investigación

(Abr 2009 – Nov 2009)

(Abr 2010 – Nov 2010)

Apoyo en el diseño, construcción y ejecución de proyectos de generación renovables de bajo costo.

- Estudio y puesta en marcha de sistemas renovables de energía eólica.
- Ejecución de pruebas de rendimiento a generadores eléctricos de bajo costo.
- Diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos de baja potencia.

MANEJO DE TECNOLOGÍA

- AutoCAD
- Softwares de gestión de energía y calidad de energía
- Softwares de programación de PLC, pantallas HMI, sistemas SCADA
- Softwares tipo CRM
- Excel (avanzado) y Access (intermedio)
- Matlab y Simulink de Matlab
- Programación en lenguaje C

IDIOMAS

- Inglés fluido
- Español (lengua materna)

CONFERENCIAS, CURSOS Y SEMINARIOS

- *Presentador*, "Software de Gestión de Energía y Calidad de Energía", Cámara de Industrias de Costa Rica, Costa Rica (virtual), diciembre de 2020
- *Curso*, "Sostenibilidad Energética", UTP, Panamá, junio de 2010
- *Congreso*, "III Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología", UTP, Panamá, agosto de 2009
- *Presentador*, "Presentación de Orientación Profesional", UTP, Panamá, junio de 2009

RECONOCIMIENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES

- Distinguido con beca completa por parte del gobierno de Panamá para cursar estudios de maestría en los EE.UU. (2012)
- Participación escolar en las Olimpíadas Panameñas de Física logrando a nivel nacional medallas de oro (2002) y plata (2003)

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 7 de septiembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Samuel García Brown, con cedula de identidad personal: 8-815-1627, panameño, Ingeniero electromecánico, con idoneidad: 2016-024-014, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61547** para el proyecto No." **"MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE"** asumiremos la responsabilidad como Ingeniero Electromecánico.

Atentamente



Samuel García Brown
CIP: 8-815-1627
Ingeniero Electromecánico



Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista
CIP: 8-208-366

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Samuel
Garcia Brown**



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 24-MAY-1988
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE: O+ **8-815-1627**
EXPEDIDA: 24-SEP-2019 EXPIRA: 24-SEP-2029



135 13



**Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



SAMUEL GARCIA BROWN
Ced.: 8-815-1627
INGENIERO
ELECTROMECANICO
C.I.N° 2016-024-014

[Signature]
Presidente Secretario



**"Se reconoce que la independencia de las profesiones
constituye una garantía esencial para la promoción,
desarrollo y protección de nuestra sociedad."**

Carnet emitido el día: 11-sep-2018
Carnet expira el día: 24-jul-2023
PIN: aCIB7-gFIYT-XMbWK





República de Panamá
La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura



En atención a que:

Samuel García Brown

con cédula de identidad personal 8815-1627.

ha llenado los requisitos exigidos por la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, le confiere las credenciales del caso por autoridad de la Ley y el presente Certificado de idoneidad para ejercer en todo el territorio nacional la profesión de

Ingeniero Electromecánico

con certificado de idoneidad 2016-024-014.


Ing. José A. Jiménez Melo
Presidente


Ing. Omar González B.
Secretario

Panamá, 9 de marzo de 2016.

HOJA DE VIDA

LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN

DATOS PERSONALES:

Cedula: 4-714-205
Edad: 42 años
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1979
Estado civil: unido
Dirección: PH 51 casa #3, residencial mirador del bosque, pacora,
Panamá, Panamá
Celular: 6628-4581; 6027-8402

Estudios:

- Técnico en ingeniería civil con especialización en edificaciones, Universidad tecnológica de panamá, centro regional de Chiriquí año 2004.
- II año, licenciatura en mercadeo con énfasis en comercio Internacional, UTP, 2006.
- Bachiller en comercio, Colegio Francisco Morazán, año 1997.

Habilidades técnicas:

- Conocimiento en computadoras (Microsoft office)
- Manejo de inventarios.
- Control y manejo de mano de obra de construcción.
- Control y análisis de actividades relacionadas a la construcción.
- Cálculos de materiales para la construcción de proyectos.
- Manejo administrativo de proyectos de construcción.
- Elaboración de avances para presentación de cuentas.

Experiencia laboral:

- EMPRESA: PANAMA VIEJO DEVELOPMENT CORP.
OCUPACION: INSPECTOR DE PROYECTO.
PROYECTO: INSPECCION DE GALERAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES EN CONSTRUCCION.
UBICACIÓN: PANAMA VIEJO, PANAMA.
PERIODO: Desde el 18 de noviembre del 2019 asta el 18 de marzo del 2020.
- EMPRESA: FGGUARDIA.
OCUPACION: INSPECTOR DE PROYECTO.
PROYECTO: INSPECCION AL PROYECTO DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO FEMENINO DE REHABILITACION, UBICADO EN LAS GARZAS DE PACORA, PANAMA, PANAMA.
PERIODO: Desde el 7 de marzo del 2019 hasta el 30 de octubre del 2018.
- EMPRESA: RECOMOSA S.A.
OCUPACION: CAPATAZ GENERAL.
PROYECTO: ADECUACION DE NUEVA SUCURSAL BANISI COSTA DEL ESTE.
UBICACIÓN: PANAMA, PANAMA.
PERIODO: Desde el 5 de abril del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2018.
- EMPRESA: GRUPO BARRERA Y ASOCIADOS.
OCUPACION: CAPATAZ DE ESTRUCTURA (FORMALETA DE CASAS ADOSADAS).
PROYECTO: ALTOS DE AZUL (PROMOTORA CASAS PASIFICAS).
UBICACIÓN: PACORA, Panama.
PERIODO: Desde el 1 de agosto del 2017 hasta 31 de marzo del 2018.
- EMPRESA: CONSTRUCTORA RIGA SERVICES S.A.
OCUPACION: CAPATAZ
PROYECTO:
UBICACIÓN: San Antonio, Panama.
PERIODO: Desde el 16 de enero del 2017 hasta el 31 de julio del 2017.
- EMPRESA: PROVEDESA.
OCUPACION: Asistente de presupuesto y costo.
PROYECTO:
UBICACIÓN: San Antonio, Panama.
PERIODO: Desde el 17 de agosto del 2015 hasta el 15 de enero del 2017.
- EMPRESA: PRODECASA. (SUB-CONTRATISTA ING. ALEJANDRO CHISMAR)
OCUPACION: ASISTENTE DE INGENIERIA
PROYECTO: Barriada SUNSET COUNTRY CLUB.
UBICACIÓN: Chorrera, Panama.
PERIODO: Desde el 2 de febrero hasta el 31 de julio del 2015.

- EMPRESA: BETESH PROPERTIES S.A.
 OCUPACION: Encargado de proyectos,
 PROYECTO: Residencial P.H. HANNA
 UBICACIÓN: Pedregal, Panama.
 PERIODO: Desde el 1 de julio del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014.
- EMPRESA: Grupo G. T. y Asociados S.A.
 OCUPACION: Encargado de proyectos,
 PROYECTO: Residencia del señor Moisés Murad.
 UBICACIÓN: Punta Pacifica, Panamá.
 PERIODO: Desde el 12 de septiembre del 2011 hasta el 30 de octubre del 2013.
- EMPRESA: CONTRAPESO S.A.
 OCUPACION: Supervisor de acabados
 PROYECTO: Terminación de Almacén Lemon cola.
 UBICACIÓN: Zona Libre de Colon, Colon, Panamá
 PERIODO: Desde el 1 de julio del 2011 hasta el 9 de septiembre del 2011.
- EMPRESA: Roberto Batista e Hijos S.A.
 OCUPACION: Supervisor y Asistente de proyectos.
 PROYECTO: Morgue judicial de Darién.
 Escuela santa rosa, capira.
 Escuela comarca embera, Darién.
 Escuela Quebrada de Limón Darién
 UBICACIÓN: Panamá, Panamá.
 PERIODO: Desde el 1 de agosto del 2010 hasta el 4 de junio del 2011.
- EMPRESA: Capital Constructions S.A.
 OCUPACION: Residente de Proyectos.
 PROYECTO: Caminos de Bocas de Toro.
 UBICACIÓN: Bocas del Toro.
 PERIODO: Desde el 5 de marzo del 2010 hasta el 10 de julio del 2010.
- EMPRESA: Yinh y Asociados S.A. y Asesores Financieros de Panamá.
 OCUPACION: Capataz de Albañilería.
 PROYECTO: Edificio Mandarin Bey.
 Farmacias Arrocha Centro comercial Centennial.
 Oficinas Sucre y Arias, calle 50.
 Remodelación de Casa Rosa y PH La Merced, San Felipe.
 UBICACIÓN: Panamá, Panamá.
 PERIODO: desde el 1 de octubre del 2008 hasta el 31 de marzo del 2010.

- EMPRESA: Administradora General de Construcciones S.A.
OCUPACION: Supervisor General.
PROYECTO: Residencial Villas de Santa Bárbara
UBICACIÓN: Tocumen, Panamá
PERIODO: Desde el 6 de agosto del 2007 hasta el 16 de julio del 2008.
- EMPRESA: Constructora DICOVSA. S.A.
OCUPACION: Maestro de obra.
PROYECTO: Residencia de Playa.
UBICACIÓN: Playa Lajas, San Félix, Chiriquí, Panamá.
PERIODO: 2006.
- Práctica profesional, inspector de obras civiles, constructora M.H., Arq. Marcela Herrera.
- Reforzador, CONELSA. Año 2003.
- Reparación y mantenimiento, finca santa Ana S.A, año 1998.
- Práctica profesional, asistencia de bodega, centro de llantas Felipe Rodríguez S.A., diciembre 2000.
- Ayudante general, TS propietarios corporation, residencial el valle.
- Ayudante general, contratista Jorge Vargas, año 1999.
- Ayudante de ejero, con concreto internacional, proyecto cabo marzo, Del 30 de enero del 2007 al 28 de julio del 2007.

Seminarios:

- Programa de capacitación para jóvenes de primer empleo, 2001.
- Orientación y conservación del medio ambiente.

Referencias Laborales:

- Yinh y asociados S.A 264-5211.
- PROVEDESA, Cesar Sanchez, gerente de recursos humanos. 239-4678.
- Oficina Grupo GT y Asociados S.A.

- Lic. Federico Domínguez, administradora general de contrataciones, 291-1002.
- Arq. Víctor Villarreal, Constructora Dicoysa S.A. cel., 6674-5848.
- Arq. Marcela herrera.
- Lic. Amabel Valdivieso, Asistente Administrativa, Roberto Batista E Hijos S., tel. 265-2461.

NOTA: "TODOS LOS DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN ESTE DOCUMENTO SERAN ENTREGADOS EL DIA DE LA ENTREVISTA"

CEFERE-FGG-ADTEC 19-072
Panamá, 29 de noviembre de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Mediante la presente certificamos que el Ingeniero **LUIS ALBERTO ALAVARCA**, portador de la cédula N°4-714-205, laboró en nuestra empresa desde el 7 de marzo de 2019 al 30 de octubre de 2019, devengando un salario mensual de Mil Cien Balboas (B/. 1,100.00), en calidad de Inspector en el proyecto indicado a continuación:


Proyecto: Inspección al Proyecto de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación

Cliente: Ministerio de Gobierno

Monto de la Obra: B/.25.8 millones aproximadamente

La participación del Sr. Alvarca fue siempre excelente en los trabajos que se le asignaron, demostrando honestidad, puntualidad y eficiencia

Muy Atentamente,
Consorcio FGG-ADTEC


Arq. Jorge E. Varela
Representante Legal

JEV/RDR/ssg



GRUPO BARRERA & ASOCIADOS, S.A.
R.U.C. 155651614-2-2017 DV 45

Panamá 2 de abril de 2018.

Jan Marcos Barrera
Presidente
Grupo Barrera, Inv., S.A.

Certifica:

Que el Señor **Luis Alvarca**, ciudadano panameño, con cédula de identidad personal No. 4-714-205 prestó sus servicios como Encargado de Obra para **Grupo Barrera & Asociados, S.A.**, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.

El Sr. Alvarca mostro durante su periodo laboral honestidad, puntualidad y eficacia en sus asignaciones.

Y para que así conste firmo esta certificación en la ciudad de Panamá a los dos (2) días del mes de abril de 2018.

Sin otra particular.

Edg. Jan Marcos Barrera.
Presidente.
Grupo Barrera & Asociados, S.A.



CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURAS

RUC 48192-0119-320004 DV 42

Tel 239-4677 239-4678 Fax 239-4679

0833-00102

www.rigaservices.net rigaservices@cwpanama.net

Panamá, 2 de abril de 2018

A QUIEN CONCIERNE:

Para los efectos correspondientes hacemos constar, que el señor **LUIS ALAVARCA** con cédula de identidad personal No. **4-714-205**, laboró en nuestra empresa desde el **16 DE ENERO DE 2017** hasta el **31 DE JULIO DE 2017**, en calidad de **CAPATAZ**, devengando un salario mensual de Mil balboas (1,000.00).

Sin más por el momento y a su disposición para cualquier consulta al respecto, quedamos de usted,

Atentamente,

CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.

Telefax: 239-4677 / 4678

gruporiga@cwpanama.net

César A. Sánchez I.
Gerente de Recursos Humanos

PROVEDESA

Edif. Pitos's Place, San Antonio, Calle Principal
RUC 500912-1-435802 D.V.04
Apartado Postal 7605, Zona 5, Panamá
Teléfono: 239-4678 Telefax: 239-4677
Email: gruporiga@cwpanama.net

Panamá, 2 de abril de 2018

A QUIEN CONCIERNE:

Para los efectos correspondientes hacemos constar, que el señor **LUIS ALAVARCA** con cédula de identidad personal **No. 4-714-205**, laboró en nuestra empresa desde el **17 DE AGOSTO DE 2015** hasta el **15 DE ENERO DE 2017**, en calidad de **CAPATAZ**, devengando un salario mensual de Mil balboas (1,000.00).

Sin más por el momento y a su disposición para cualquier consulta al respecto, quedamos de usted,

Atentamente,



PROVEDESA

Telefax: 239-4677 / 4678
gruporiga@cwpanama.net

César A. Sánchez T.
Gerente de Recursos Humanos

Panamá, 20 de Junio de 2013

A QUIEN CONCIERNE:


Por este medio, nos permitimos dar referencia del señor **LUIS A. ALAVARCA M.**, con cédula de identidad N°4-714-205, quien laboró en nuestra empresa **ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.**, en calidad de Asistente de Ingeniería desde el 01 de Octubre de 2010 al 30 de Agosto de 2011.

Durante su permanencia en la empresa el Señor **ALAVARCA**, desempeñó sus funciones con un alto grado de responsabilidad, honradez y puntualidad.

Sin otro particular, nos despedimos, quedando a su entera disposición para cualquier otra consulta que tenga a bien realizar.

Atentamente,

ROBERTO BATISTA E HIJOS, S.A.



Roberto Batista R.
Representante Legal

/amv



Yinh y Asociados, S.A. - Ingenieros

Apartado 0819-09649, Panamá, R. de P. e-mail:yasa@gmiconsul.com - Tels:264-5211 / 264-5294 • Fax:263-9557

Panamá, 09 de Junio de 2009.

A QUIEN CONCIERNE:

Por este medio certificamos que el señor **LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN** con cédula de identidad personal número 4-714-205 y seguro social número 4-714-205, laboro en la empresa **YINH Y ASOCIADOS, S.A.** desde el 01 de Octubre de 2008 hasta el 09 de Junio de 2009.

El señor **ALAVARCA** desempeño el cargo de **CAPATAZ**, demostrando, eficiencia, cumplimiento y responsabilidad en las labores asignadas, devengando un salario mensual de **B/300.00**

Atentamente,

YINH Y ASOCIADOS, S.A.

Juan A. Yinh
Gerente General

JAY/ml

c.c. archivo personal


LA ADMINISTRADORA DE GESTION HUMANA

CERTIFICA

Que el señor **LUIS ALBERTO ALAVARCA** con cédula de Identidad Personal 4-714-205 y Seguro Social 4-714-205 laboró al servicio de la empresa en el proyecto **EDIFICIO CABOMARZO** desde el Treinta (30) de Enero de 2007 hasta el Veintiocho (28) de Julio de 2007, vinculado mediante un contrato Definido por Fase, desempeñándose como **AYUDANTE EJERO**, con una asignación básica de B/ 2.37 (Dos Balboas con Treinta y Siete Centavos) por Hora.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los Once (11) días del mes de Agosto de 2007.

Atentamente,


Lic. SANDRA LONDOÑO VELEZ
Administradora Gestión Humana
Proyecto Edificio Cabomarzo
Teléfono 226 50 03

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES VICVASA, S.A.

(DICOVSA)

El Cangrejo, Edificio Lápida
Teléfono 323-3727 774-8630 674-5948
RUC. 201133-1-395395 D.V. 28



Panamá, 25 de marzo del 2006.

A QUIEN CONCIERNE
Ciudad de David.

Estimados Señores:

Por este medio, hacemos de nuestro conocimiento que el Sr. Luis Alvarca Moran , con cédula de identidad personal 4-714-205, a elaborado en nuestra empresa como Maestro de Obra, de una forma responsable y puntual, por lo que lo recomendamos para desempeñar dicho cargo.

Sin más que agregar y agradecidos por su atención, quedamos de ustedes,

Atentamente

Arq. Víctor V. Villarreal S.
Presidente y Secretario

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 12 de abril de 2022

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Luis Alvarca, con cedula de identidad personal: 4-714-205 panameño, Técnico en construcción, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: **61287** para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA CALLE EN KUNA NEGA-SECTOR LA PAZ", asumiremos la responsabilidad con técnico en edificaciones.

Atentamente



Luis Alvarca
CIP: 4-714-205
Técnico en Edificaciones



ELIZABETH GARRIDO DE BATISTA
Representante legal.
C.I.P: 8-208-366

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Luis Alberto Alvarca Moran



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 10-ENE-1979
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIRIQUI, DAVID
SEXO: M
EXPEDIDA: 21-FEB-2020

4-714-205

TIPO DE SANGRE
FECHA: 21-FEB-2030



TE TRIBUNAL ELECTORAL



4-714-205

E 520010765

CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL IDONEO

Panamá, 7 de septiembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados señores:

Por medio le comunico que. Yo, Luis Alberto Alvarca, con cedula de identidad personal: 4-714-205, panameño, Tecnico en Edificaciones, de ser favorecido con la adjudicación del acto público No: 61547 para el proyecto No. "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE" asumiremos la responsabilidad como Tecnico en edificaciones.

Atentamente



Luis Alberto Alvarca
CIP: 4-714-205
Técnico en Edificaciones



Representante Legal
Elizabeth Garrido de Batista
CIP: 8-208-366

**JUNTA TÉCNICA
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**
Ley 15 de 26 de Enero de 1959



Identificación de:

LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN

TECNICO EN INGENIERIA EN ESP EN

EDIFICACIONES

C.I. No. 2007-501-038

Panamá 31 DE JULIO DE 2007


PRESIDENTE


SECRETARIO

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Luis Alberto Alvarca Moran

NUMERO: 4714

FECHA DE VALIDACION: 16-ENE-2019

LUGAR DE NACIMIENTO: DAVID, CHIRIQUI

EDAD: 40

EXPIRENCIA EN REG. NAC: 93104 16-FEB-2016

4-714-205



CAJA DE SEGURO SOCIAL
REPUBLICA DE PANAMA

LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN

CEDULA 04 -00714-000205

NO DE S.S.

FECHA DE NAC 10/01/1979

VENCIMIENTO: 02



ASEGURADO

REPUBLICA DE PANAMA

AUTORIDAD DEL TRÁFICO Y TRANSPORTES TERRESTRES

LICENCIA DE CONDUCIR

LUIS ALBERTO ALAVARCA MORAN

PROVINCIAS: PANAMÁ

FECHA DE NACIMIENTO: 10/01/1979

FECHA DE EXPIRACION: 31/05/2014

SERVICIO: 26/09/2010

FECHA DE EXPIRACION: 31/05/2014

**CARTA DE
REFERENCIA
FINANCIERA**



Panamá, 1 de septiembre de 2023

Señores

Ministerio de Presidencia / Dirección de asistencia social / Licitación 61547

Ciudad

Estimados señores Ministerio de Presidencia / Dirección de asistencia social / Licitación 61547:

Reciban un cordial saludo en nombre de Banco General.

A solicitud de Roberto Batista E Hijos, S.A. con RUC No. 36643400174340001, certificamos que mantienen un producto o servicio vigente desde agosto de 2007 en el Banco.

Actualmente, Roberto Batista E Hijos, S.A. mantiene en nuestra institución:

Una (1) línea(s) de sobregiro, con límite total otorgado de cinco (5) cifras medias.

Una (1) cuenta(s) corriente(s), con saldo promedio de cinco (5) cifras altas.

De requerir información adicional, y con la debida autorización de nuestro cliente, con mucho gusto le atenderemos.

Atentamente,

Banco General

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial y se expide por gestión y autorización expresa de la parte interesada y no implica responsabilidad alguna para Banco General, S.A., subsidiarias, afiliadas, directores, accionistas ni colaboradores. Esta carta no requiere firma. El contenido de esta nota solo puede confirmarse dentro de un término de 60 días contados a partir de la fecha de esta nota y en día hábil, comunicándose al (507) 800-5000 o (507) 300-5000 de Atención al Cliente de Banco General, suministrando el número de referencia indicado en esta nota. Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

Ref.09-2023-00397

Página 1 de 1

**CARTA DE
INTENCIÓN DE
FINANCIAMIENTO**



balboafactoring

P.H. Aseguradora Ancón / Piso 20-R
Costa del Este / Ciudad de Panamá
Tel. 269-1010 / www.balboafactoring.com

Panamá, 05 de septiembre de 2023

Señores

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Ciudad.

Referencia: Licitación No. 61547

Para: "MEJORAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE."

Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente, nos permitimos confirmar lo siguiente:

Que nuestra Institución Financiera esta anuente a otorgar a la sociedad **ROBERTO BATISTA E HIJOS S.A.** el financiamiento hasta por un monto de B/. 173,702.86 (Ciento setenta y tres mil setecientos dos con 86/100), en caso de que le sea adjudicada la Licitación Publica en referencia, una vez cumplidos con los términos y condiciones establecidos con nuestro cliente, según parámetros y políticas de Balboa Factoring, S.A.

Esta información la suministramos sin responsabilidad para Balboa Factoring, S.A. y ninguno de sus oficiales.

Atentamente,

Pía Soto
Oficial de cumplimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	★	MEJORAS Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE	180 días	lun 11/9/23	vie 8/3/24	
2	★	PRELIMINAR				
3	★	LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL	7 días	lun 11/9/23	dom 17/9/23	
4	★	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA,1 LOGO GRAV. AZUL	7 días	lun 11/9/23	dom 17/9/23	
5	★	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	7 días	lun 11/9/23	dom 17/9/23	
6	★	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40 M	7 días	lun 11/9/23	dom 17/9/23	
7	★	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES	7 días	sáb 2/3/24	vie 8/3/24	
8	★	NIVELACION DE AREA DE URGENCIA	7 días	lun 11/9/23	dom 17/9/23	
9	★	REPLANTEO Y DEMARCACION	7 días	lun 11/9/23	dom 17/9/23	
10	★					
11	★	DEMOLICION				
12	★	DEMOLICION DE AREA ABIERTA DE COVID,INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	5 días	lun 18/9/23	vie 22/9/23	9
13	★					
14	★	CONSTRUCCION DEL AREA DE URGENCIAS				
15	★	CEMENTO CORRIDO, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG, C/R	6 días	vie 15/9/23	lun 1/6/26	12
16	★	BLOQUE DE 6", RELLENOS	5 días	mar 12/9/23	lun 18/9/23	15CC+2 días

ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-024

Roberto E. Batista
CIP-8-807-859

LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
COMISIÓN NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Elizabeth Garrido de Batista
CIP-8-208-366

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart											
							sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
17	★	ZAPATAS DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	6 días	mar 12/9/23	jue 28/9/23	12	[Gantt bar from Sep 12 to Sep 18]											
18	★	PEDESTAL AL CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	2 días	mar 12/9/23	sáb 30/9/23	17	[Gantt bar from Sep 18 to Sep 20]											
19	★	VIGA SISMICA DE 0.30 X 0.30 M. CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R	5 días	mar 12/9/23	jue 5/10/23	18	[Gantt bar from Sep 20 to Sep 25]											
20	★	COLUMNAS DE 0.15 X 0.30M CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG C/R	5 días	mar 12/9/23	mar 10/10/23	19	[Gantt bar from Sep 25 to Sep 30]											
21	★	VIGAS DE 0.15 X 0.30 M. CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. C/R # 5, EST. # 3	4 días	mar 12/9/23	sáb 14/10/23	20	[Gantt bar from Sep 30 to Oct 3]											
22	★	VIGA DE AMARRE DE CONCRETO DE 3,000 CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2. 2 # 5, EST. # 3	4 días	mar 12/9/23	mié 18/10/23	21	[Gantt bar from Oct 3 to Oct 7]											
23	★	TECHO COMPLETO (LAMINA DE DE ZINC GALVANIZADAS DE 2" x 4", CAL. 16, ALINEADORES DE 1/2", CABALLETE LISO DE 24"	10 días	jue 19/10/23	sáb 28/10/23	22	[Gantt bar from Oct 7 to Oct 17]											
24	★	FASCIA PERIMETRAL, (CARRIOLA DE METAL 2" X 6". CAL.16)	2 días	dom 29/10/23	lun 30/10/23	23	[Gantt bar from Oct 17 to Oct 19]											
25	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	8 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	24	[Gantt bar from Oct 19 to Nov 6]											
26	★	COLOCACION DE VENTANAS (VIDRIO, MARCO DE ACERO INOXIDABLE), COMPLETAS	5 días	mar 12/9/23	dom 12/11/23	25	[Gantt bar from Nov 6 to Nov 11]											
27	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEJAS DE HIERRO DE 1" X 1" X 1/8", COMPLETA	5 días	mar 12/9/23	vie 17/11/23	26	[Gantt bar from Nov 11 to Nov 16]											



 Elizabeth Garrido de Batista
 CIP:8-208-366


ROBERTO E. BATISTA
 INGENIERO CIVIL
 LICENCIA N° 2010-006-24
 Roberto E. Batista
 CIP: 8-807-859
 LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1958
 JUNTA NACIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Tarea [Bar] Resumen inactivo [Bar]
 División [Bar] Tarea manual [Bar]
 Hitos [Bar] solo duración [Bar]
 Resumen [Bar] Informe de resumen manual [Bar]
 Resumen del proyecto [Bar] Resumen manual [Bar]
 Tarea inactiva [Bar] solo el comienzo [Bar]
 Hitos inactivos [Bar] solo fin [Bar]


Tareas externas [Bar]
 Hitos externos [Bar]
 Fecha límite [Bar]
 Progreso [Bar]
 Progreso manual [Bar]

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
28	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.15 M, ANTIPANICO CON VIDRIO, COMPLETA	4 días	mar 12/9/23	mar 21/11/23	27
29	★	PARED DE BLOQUE DE 4" CEMENTO	7 días	mar 12/9/23	mar 28/11/23	28
30	★	REPELLO LISO DE 1.50 CM DE ESPESOR	7 días	mar 12/9/23	mar 5/12/23	29
31	★	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	3 días	mar 12/9/23	vie 8/12/23	30
32	★	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP. =0.10 M, COMPLETO	6 días	mar 12/9/23	jue 14/12/23	31
33	★	PISO PARA RAMPA, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, C/R, 4 # 5 EN A/D. EST. # 3	3 días	vie 15/12/23	dom 17/12/23	32
34	★	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE TUBOS DE 2" GALV. VERTICAL /HORIZONTAL, AREA DE URGENCIA - INYECTABLES/INHALOTERAPIA), AMBOS LADOS	5 días	lun 18/12/23	vie 22/12/23	33
35	★	COLOCACION DE BALDOSAS COMPLETAS	4 días	sáb 23/12/23	mar 26/12/23	34
36	★	ZOCALO PARA BALDOSAS, COMPLETO	3 días	mar 12/9/23	vie 29/12/23	35
37	★	CONSTRUCCION DE ACERAS, E = 0.10 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R URGENCIA E INHALOTERAPIA), COMPLETAS	10 días	sáb 30/12/23	lun 8/1/24	36
38	★	CONSTRUCCION DE CANAL DE 0.10 X 0.30 M, CON PARRILLA COMPLETA	4 días	mar 9/1/24	vie 12/1/24	37
39	★	DIVISION PLEGABLE DE 1.80 X 6.50 M	5 días	mar 12/9/23	mié 17/1/24	38
40	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	8 días	mar 12/9/23	jue 25/1/24	39




 Elizabeth Garrido de Batista


 CIP: 8-208-366





 Roberto E. Batista


 CIP: 8-807-859


Tarea:  Tarea


 División:  División


 Hitos:  Hitos


 Resumen:  Resumen


 Resumen del proyecto:  Resumen del proyecto


 Tarea inactiva:  Tarea inactiva


 Hitos inactivos:  Hitos inactivos


Resumen inactivo:  Resumen inactivo


 Tarea manual:  Tarea manual


 solo duración:  solo duración


 Informe de resumen manual:  Informe de resumen manual


 Resumen manual:  Resumen manual


 solo el comienzo:  solo el comienzo


 solo fin:  solo fin

Tareas externas:  Tareas externas

 Hitos externos:  Hitos externos

 Fecha límite:  Fecha límite

 Progreso:  Progreso

 Progreso manual:  Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
41	★	SUMINISTRO Y INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	8 días	vie 26/1/24	vie 2/2/24	40
42	★	DESMONTE DE PUERTA DE 1.40 X 2.00 M, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	3 días	sáb 3/2/24	lun 5/2/24	41
43	★	DESMONTE MUEBLE SOBRE EL LAVAMANO DE 0.60 X 2.60 INCLUYE : ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	3 días	mar 6/2/24	jue 8/2/24	42
44	★					
45	★	MEJORAS AREA DE INYECTABLES/INHALOTERAPIA				
46	★	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	5.44 días	mar 6/2/24	sáb 10/2/24	43
47	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC. INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA	4 días	mar 12/9/23	jue 15/2/24	46
48	★	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8), COMPLETO	3 días	vie 16/2/24	dom 18/2/24	47
49	★	PARED DE BLOQUE DE 4", CEMENTO	5 días	mar 12/9/23	vie 23/2/24	48
50	★	REPELLO LISO DE 1.50 CM DE ESPESOR	5 días	mar 12/9/23	mié 28/2/24	49
51	★	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24	50
52	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	1 día	sáb 2/3/24	sáb 2/3/24	51

INGENIERO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-0006-024

Elizabeth Garrido de Batista
CIP:8-208-366

Roberto E. Batista
FON: 8-607-859

LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1989
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

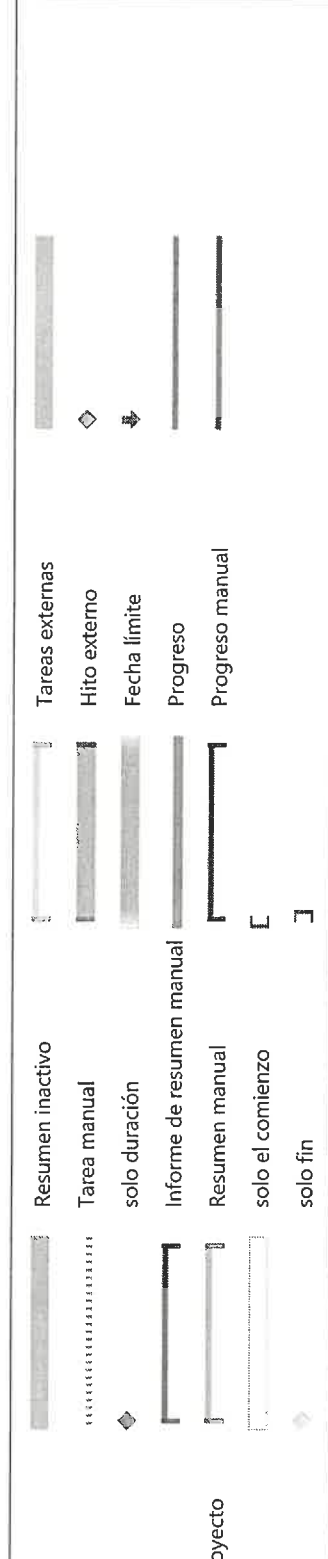
Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
53	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	2 días	mar 12/9/23	lun 4/3/24	52
54	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	1 día	mar 5/3/24	mar 5/3/24	53
55	★					
56	★	MEJORAS AREA DE ODONTOLOGIA				
57	★	DEMOLICION DE PARED, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	2 días	mar 12/9/23	jue 7/3/24	54
58	★	DEMOLICION DE MUEBLE DE MADERA DE 1.10 X 2.81 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	2 días	mar 12/9/23	mié 13/9/23	56
59	★	DEMOLICION DE CIELORASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	2 días	mar 12/9/23	sáb 9/3/24	57
60	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	4 días	mar 12/9/23	dom 17/9/23	58
61	★	CONSTRUCCION DE PARED, (ENTRAMADO + LAMINA DE GYPSUM DE 5/8), COMPLETO	5 días	mar 15/8/23	jue 15/2/24	55
62	★	PINTURA VINILICA (BASE + 2 ULTIMAS)	2 días	mar 15/8/23	sáb 10/2/24	57
63	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.15 M, COMPLETA	1 día	mar 15/8/23	mar 15/8/23	61
64	★	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES CON GAVETAS DE 0.60 X 1.50 M, COMPLETO	1 día	mar 15/8/23	mar 15/8/23	62

ROBERTO E. BATISTA G
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-024
 División Hito
 Resumen
 Resumen del proyecto
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 Roberto E. Batista
 CIP: 8-607-859
 Hito inactivo




Elizabeth Garrido de Batista
 CIP:8-208-366

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
65		SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS COMPLETO	1 día	mar 15/8/23	mar 15/8/23	63
66		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES AEREO DE MADERA DE 0.60 X 1.80 M, COMPLETO	2 días	mar 12/9/23	vie 22/9/23	64
67		SALIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4" O PVC	3 días	mar 15/8/23	mar 20/2/24	65
68		SALIDA DE AGUAS NEGRAS DE 4" O PVC	3 días	mar 12/9/23	jun 25/9/23	66
69						
70		AREA EXTERNA				
71		LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO, COMPLETO	5 días	mar 12/9/23	sáb 30/9/23	68
72		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS DE 3/4" DE PVC, DE ODONTOLOGIA A BAÑOS	5 días	mar 12/9/23	sáb 30/9/23	68
73		SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIAS DE 4" PVC, DE ODONTOLOGIA A BAÑOS	4 días	mar 12/9/23	vie 29/9/23	68
74		CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.80 X 0.80 M. COMPLETA	5 días	mar 12/9/23	sáb 30/9/23	68
75						
76		EQUIPAMIENTO				
77		EQUIPO DENTAL COMPLETO CON UNIDAD ADOSADA AL SILLON (ELECTROHIDRAULICO BASE GIRATORIA), FICHA TECNICA 71290	10 días	mar 12/9/23	mar 10/10/23	74
78		SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACODICIONADO SPLIT12,000 BTU, COMPLETO	10 días	mar 12/9/23	vie 20/10/23	77

ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-024
 División
 Hito
 Resumen
 Roberto E. Batista
 LEY 18 DEL 28 DE ENERO DE 1958
 Tarea inactiva
 Hito inactivo


Elizabeth Garrido de Batista
 CIP:8-208-366

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart											
							sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
79	*	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU, COMPLETO	10 días	mar 12/9/23	lun 30/10/23	78	[Gantt bar from 12/9/23 to 30/10/23]											
80	*	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE DE MESA AUTOMATICO ENTRE 21.5 Y 28 LITROS, FICHA TECNICA 70905	10 días	mar 12/9/23	jue 9/11/23	79	[Gantt bar from 12/9/23 to 9/11/23]											
81	*	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INALAMBICA TIPO LED PARA POLIMERACION DE MATERIALES FOTOCURABLES, FICHA TECNICA 105441	10 días	mar 12/9/23	jue 21/9/23	89	[Gantt bar from 12/9/23 to 21/9/23]											
82	*	TABURETE METALICO GIRATORIO	5 días	mar 12/9/23	mar 26/9/23	81	[Gantt bar from 12/9/23 to 26/9/23]											
83	?																	
84	*	INJECTABLE/INHALOTERAPIA																
85	*	SUMINISTRO DE CAMILLA	0 días	mar 12/9/23	mar 12/9/23	82	[Milestone diamond at 12/9/23]											
86	*	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	0 días	mar 12/9/23	mar 12/9/23	85	[Milestone diamond at 12/9/23]											
87	*	SUMINISTRO DE SILLONES PARA INHALOTERAPIA	0 días	mar 12/9/23	mar 12/9/23	85	[Milestone diamond at 12/9/23]											
88	*	SUMINISTRO DE SILLA TIPO SECRETARIA	0 días	mar 12/9/23	mar 12/9/23	85	[Milestone diamond at 12/9/23]											
89	?																	



 Elizabeth Garrido de Batista

 CIP: 8-208-366



 Roberto E. Batista

 CIP: 8-807-859

Tarea Division Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo

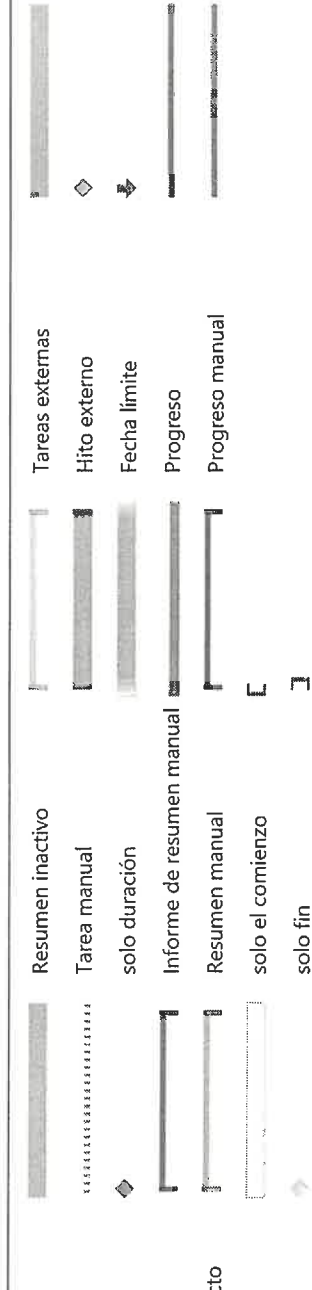
Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual

Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Calendar											
							sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar					
90	?	Descripción																
91	?	SUMINISTRO DE ESCRITORIO DE METAL	0 días	mar 12/9/23	mar 12/9/23	88												
92	?																	
93	?	URGENCIAS																
94	?	SUMINISTRO DE CAMILLA	2 días	mar 12/9/23	mié 13/9/23													
95	?	SUMINISTRO DE RECIPIENTE PARA OBJETOS PUNZOCORTANTES	2 días	mar 12/9/23	mié 13/9/23													
96	?																	
97	?	ELECTRICIDAD																
98	?	CONSTRUCCION DE TAPIA CON RECEPTACULO DE MEDIDOR NEMA 3R, PANEL DE 12 CIRCUITOS CON IP 60 AMP., 2P BARRA DE GROUND CON REGISTRO DE INSPECCION, PUNTO DE ENTRADA, CABLEADO, ACCESORIOS, COMPLETA	5 días	mar 12/9/23	sáb 16/9/23													
99	?	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS MONOFASICOS DE 120/240 V, BARRAS DE 200 AMP., BREAKER, CABLEADO, ACCESORIO, COMPLETO	5 días	mar 12/9/23	sáb 16/9/23													

ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-024
 Resumen
 CIP: 8-807-859
 PRIMA
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1899
COMPANIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 Hitos inactivos

Elizabeth Garrido de Batista
 CIP: 8-208-366



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart											
							sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	[Empty]				
100		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED RECTANGULARES, IP67, 100 W, CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, BREAKERS, ACCESORIOS, COMPLETAS	5 días	mar 12/9/23	sáb 16/9/23		[Gantt bar from Sep 12 to Sep 16, 2023]											
101		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE TECHO EMPOTRADAS REDONDAS, IP40, IMPERMEABLES DE 15 W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS, COMPLETAS		mar 12/9/23			[Gantt bar from Sep 12 to Sep 16, 2023]											
102		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCE 110 V CON CAJA 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIA, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	5 días	mar 12/9/23	sáb 16/9/23		[Gantt bar from Sep 12 to Sep 16, 2023]											
103		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 220 V PARA AIRE ACONDICIONADO, CON CAJAS 4 X 4, TAPA DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, TUBERIAS, ACCESORIOS, COMPLETOS	158 días	mar 12/9/23	vie 16/2/24		[Gantt bar from Sep 12, 2023 to Feb 16, 2024]											
104		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 LASOS, 120 V CON ACCESORIOS, INCLUYE: DETECTORES, ESTACIONES, COMPLETO	158 días	mar 12/9/23	vie 16/2/24		[Gantt bar from Sep 12, 2023 to Feb 16, 2024]											

ROBERTO E. BATISTA G.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 2010-006-024

Roberto E. Batista
 CIP: 8-807-859

Elizabeth Garrido de Batista
 CIP: 8-208-366

LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Area: []
 División: []
 Hitos: []
 Resumen: []
 Resumen del proyecto: []
 Area inactiva: []
 Hitos inactivos: []

Resumen inactivo: []
 Tarea manual: []
 solo duración: []
 Informe de resumen manual: []
 Resumen manual: []
 solo el comienzo: []
 solo fin: []

Tareas externas: []
 Hitos externos: []
 Fecha límite: []
 Progreso: []
 Progreso manual: []

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
105		UMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO LUMINISCENTES, COMPLETO	158 días	mar 12/9/23	vie 16/2/24	
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						



ROBERTO E. BATISTA
 División
 Hito
 Resumen
 Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hito inactivo

Elizabeth Garrido de Batista
 CIP: 8-208-366

Roberto E. Batista
 CIP: 8-807-859

Legend:

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual
- Resumen inactivo
- Tarea manual
- solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
- solo el comienzo
- solo fin
