

INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 junio de 2006, que regula la contratación pública, para el proyecto No. 61537, “**REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA UN ESPACIO TECNOLÓGICO – EN EL PARQUE OMAR**”, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá, provincia de Panamá, cuyo acto público fue celebrado el día 12 de septiembre de 2023, una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Documentos con observaciones de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
1.	GRUPO ANCHOR, S.A.	B/.154,558.85	A. Plan de Propuesta del Proyecto.	Subsanaado
			B. Cronograma.	Subsanaado

Se procede a incluir la documentación subsanada en el expediente y se publica en la página web de la DAS.

Dado en la ciudad de Panamá, el 14 de septiembre de 2023.


Lic. ROLANDO PERALTA AGUILAR
Abogado Analista



Panamá, 13 de septiembre de 2023.

Señores
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
E.S.D.

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo de parte nuestra y deseos de éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio yo **JOEL ARMANDO MOGORUZA** con cédula de identidad 7-703-2476, hago formal entrega de documentos a subsanar del Acto Público 61537 para “ **REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA ESPACIO TECNOLÓGICO - PARQUE OMAR.**”

Dicha subsanación consta de lo que a continuación detallo:

- Plan de Propuesta del Proyecto firmado y sellado por el personal idóneo y el representante Legal.
- Cronograma con los días calendarios.

Agradeciendo la atención que le brinde a la misma.

Atentamente,


Licdo. Joel A. Mogoruz Vázquez
Representante Legal
Grupo Anchor.

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por:



Fecha: 13/9/23 Hora 9:41 a.m.



WWW.GRUPOANCHOR.COM

☎ Teléfono: 224-6675

📍 **Edificio Katana.** Local #2
Calle W - Parque Lefevre
Panamá, República de Panamá

✉ administracion@grupoanchor.com



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

ACT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
PANAMÁ - SAN FRANCISCO - REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA UN ESPACIO TECNOLÓGICO - EN EL PAQUE OMAR					
PRELIMINARES					B/.4,950.00
070752	LETRERO TIPO 1 (1.20 X 2.40) METAL	C/U	1.00	B/.900.00	B/.900.00
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV. AZUL	C/U	1.00	B/.400.00	B/.400.00
*TEMPO	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	C/U	1.00	B/.400.00	B/.400.00
1118	CASETA DE CONSTRUCCIÓN 2.40 X 2.40 M	C/U	1.00	B/.750.00	B/.750.00
75113	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES	PLANTA	10.00	B/.250.00	B/.2,500.00
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA					B/.7,575.02
11014	DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUES, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	90.67	B/.20.00	B/.1,813.40
11066	DEMOLICIÓN DE PARED DE GYPSUM, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	35.53	B/.4.00	B/.142.12
681141	DEMOLICIÓN DE LOSETA DE HORMIGÓN, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M3	1.34	B/.25.00	B/.33.50
110111	DEMOLICIÓN DE SOBRE DE LAVAMANOS, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INSDIQUE EL INSPECTOR	M3	0.52	B/.350.00	B/.182.00
11156	DEMOLICIÓN DE MACETAS RELLENAS, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M3	3.56	B/.350.00	B/.1,246.00
11092	DEMOLICIÓN DEL MUEBLE DE COCINA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	2.88	B/.125.00	B/.360.00
010262	DEMOLICIÓN DE VENTANAS FRANCESAS, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	12.03	B/.10.00	B/.120.30



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

11017	DEMOLICIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 1.00 X 2.10, INCLUYE MARCO + ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	C/U	9.00	B/.20.00	B/.180.00
110116	DESMONTE DE PUERTAS DE METAL, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	6.30	B/.50.00	B/.315.00
1195	DESMONTE DE PUERTA DE BAÑO DE 0.60 X 1.70 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	C/U	3.00	B/.20.00	B/.60.00
11235	DESMONTE DE TRAGALUZ DE GYPSUM	M2	8.51	B/.15.00	B/.127.65
110162	DEMOLICIÓN DE CANAL DE TECHO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	ML	23.40	B/.12.00	B/.280.80
11037	DEMOLICIÓN DE TECHO TRASLUCIDO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	34.80	B/.15.00	B/.522.00
010262	DEMOLICIÓN DE TECHO DE TEJALIT, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	19.22	B/.15.00	B/.288.30
11238	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	321.00	B/.3.00	B/.963.00
010206	DEMOLICIÓN DE PISO DE CERAMICA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	313.65	B/.3.00	B/.940.95
ESTRUCTURA					B/.33,632.30
2134	PARED DE BLOQUES DE 4" DE CEMENTO	M2	18.16	B/.45.00	B/.817.20
66203	PAREDES DE GYPSUM	M2	22.96	B/.30.00	B/.688.80
2583	VIGA DE AMARRE DE 0.30 X 0.10M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	0.97	B/.32.00	B/.31.04
721105	CERAMICA MATE DE 0.20 X 0.60 M. ESTILO MADERA, COLOR CLARO	M2	73.00	B/.35.00	B/.2,555.00



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

721106	CERAMICA MATE DE 0.58 X 0.58M, ESTILO ESPAÑOL, COLORES: OCRE Y AZUL	M2	36.00	B/.35.00	B/.1,260.00
9452	CERAMICA BRILLANTE DE 0.10 X 0.20 M COLOR BLANCO	M2	86.00	B/.35.00	B/.3,010.00
94518	CERAMICA BRILLANTE DE 0.33 X M, COLOR BLANCO	M2	26.00	B/.35.00	B/.910.00
5270	CERAMICA PORCELAMICA MULTICOLOR ESTILO PIEDRA DE 0.30 X 0.60 M	M2	23.00	B/.35.00	B/.805.00
66132	CIELO RASO DE PVC LINEAL, COLOR BLANCO	M2	290.00	B/.18.00	B/.5,220.00
46184	TECHO TRASLUCIDO DE POLICARBONATO ONDULADO	M2	50.95	B/.18.00	B/.917.10
4622	CARRIOLA 2"X4" X 10', CAL.16	ML	21.60	B/.14.00	B/.302.40
48126	PERNOS DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" CON TUERCA Y ARANDELA	C/U	35.00	B/.7.50	B/.262.50
4621	CARRIOLA 2"X6", CAL.16	ML	55.20	B/.16.00	B/.883.20
45169	TUBO CUADRADO DE 3"X3"X1/4"	ML	16.08	B/.40.00	B/.643.20
68734	PLACA LISA DE 6"X6"X1/4" CON 4 PERNOS DE 1/2, TUERCA Y ARANDELA	C/U	6.00	B/.50.00	B/.300.00
2820	PEDESTAL DE 0.15 X 0.15 X 0.25 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	0.03	B/.450.00	B/.13.50
41204	PLATO DE 4"X6"X1/4"	C/U	6.00	B/.50.00	B/.300.00
42186	CANAL DE ALUMINIO. CAL.18	ML	27.60	B/.55.00	B/.1,518.00
104908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1"X 1/8" COMPLETO	ML	25.00	B/.12.00	B/.300.00
687554	COLECTOR DE 8", PVC, ESC. 40	ML	32.86	B/.16.00	B/.525.76
54250	PAPEL TAPIZ, MODELO A ESCOGER POR EL DUEÑO	M2	31.00	B/.12.00	B/.372.00
9118	PINTURA ACRILICA, COLOR MORADO, (BASE + 2 ULTIMAS) SALÓN I	m2	49.00	B/.7.50	B/.367.50
72684	PINTURA ACRILICA, COLOR NEGRO, (BASE +2 ULTIMAS),	M2	37.00	B/.7.50	B/.277.50

PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA:2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

	COLUMNAS Y PARED DE FONDO				
94965	PINTURA ACRILICA, COLOR BLANCO, (BASE +2 ULTIMAS), AREAS COMUNES, OFICINA ADM. CUARTO DE PERSONAL, ALMACÉN Y DEPOSITO	M2	336.00	B/.7.50	B/.2,520.00
66201	NICHO DE GYPSUM	M2	62.00	B/.7.50	B/.465.00
040103	PISO DE HORMIGÓN PULIDO, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG, ACABADO LISO	M2	220.20	B/.38.00	B/.8,367.60
	VENTANAS				B/.7,427.20
6316	VENTANA TIPO FRANCESA	M2	1.02	B/.160.00	B/.163.20
635	VENTANA DE VIDRIO CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	45.40	B/.160.00	B/.7,264.00
	PUERTAS				B/.2,600.00
61214	PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 2.10 X 1.00 M.INCLUYE MARCO, COLOR BLANCO, COMPLETA	C/U	3.00	B/.200.00	B/.600.00
6271	PUERTA DE VIDRIO DE 2.10 X 1.00 M, CON MARCO DE ALUMINIO, COLOR NEGRO, INLCUYE: CERRAJERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y LUCETA DE 0.10 X 1.00 M,COLOR BLANCO, COMPLETA	C/U	4.00	B/.200.00	B/.800.00
61211	PUERTA DE MADERA DE 2.10 X 1.00 M CON MARCO DE MADERA SOLIDA, COLOR BLANCO CON SISTEMA BIDIRECCIONAL COMPLETA	C/U	1.00	B/.200.00	B/.200.00
61224	PUERTA DE MADERA DE 2.10 X 1.00 M CON MARCO DE MADERA SOLIDA, BARNIZADA COMPLETA	C/U	1.00	B/.200.00	B/.200.00
61227	PUERTA DE MADERA DE 2.10 X 1.00 M CON MARCO DE MADERA SOLIDA, COLOR GRIS COMPLETA	C/U	2.00	B/.200.00	B/.400.00

☎ Teléfono: 224-6675

📍 **Edificio Katana.** Local #2
 Calle W - Parque Lefevre
 Panamá, República de Panamá

✉ administracion@grupoanchor.com

WWW.GRUPOANCHOR.COM





PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

6279	PUERTA DOBLE DE VIDRIO DE 2.50 X 2.00 M, CON MARCO DE ALUMINIO, COLOR NEGRO, INCLUYE: CERRAJERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO, CON SISTEMA DE DOBLE DIRECCIÓN, COMPLETA	C/U	1.00	B/.400.00	B/.400.00
BAÑOS					B/.12,247.00
941020	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE INODOROS COMPLETOS	C/U	6.00	B/.150.00	B/.900.00
726140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINAL CERAMICA, C/ FERRETERIA, COMPLETO	C/U	4.00	B/.150.00	B/.600.00
941021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL COMPLETO	C/U	3.00	B/.150.00	B/.450.00
040214	CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS COMUN DE CONCRETO	M2	0.88	B/.150.00	B/.132.00
941059	SIUMINISTRO E INSTALCIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO	C/U	6.00	B/.50.00	B/.300.00
941013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFOS PARA LAVAMANOS COMPLETO	C/U	6.00	B/.50.00	B/.300.00
725129	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE PORTA PAPEL TOALLA	C/U	1.00	B/.50.00	B/.50.00
941089	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE LLAVE DE AGUA	C/U	2.00	B/.50.00	B/.100.00
941067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE DUCHA	C/U	1.00	B/.50.00	B/.50.00
33213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMAPARAS DIVISORIAS DE ACRILICO, INCLUYE: CINCO (5) PUERTAS CON SUS HERRAJES, COLOR A ESCOGER POR EL INSPECTOR EN COORDINACIÓN CON EL DUEÑO	ML	13.90	B/.350.00	B/.4,865.00
080205	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE ALUMINIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	C/U	4.00	B/.75.00	B/.300.00
501057	ESTANTERIAS DE ALUMINIO DE TRES (3) NIVELES DE 1.98 X 1.20 M	C/U	14.00	B/.290.00	B/.4,200.00

Telefono: 224-6675

Edificio Katana, Local #2,
Calle W - Parque Lefevre
Panama, Republica de Panama

administracion@grupoanchor.com

WWW.GRUPOANCHOR.COM



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

CUARTO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO					B/.2,605.00
501109	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE SOFA DE TRES (3) PUESTOS	C/U	2.00	B/.500.00	B/.1,000.00
5014468	NEVERA DE 8 PIES CUBICOS	C/U	1.00	B/.550.00	B/.550.00
71128	MESA DE MADERA ESMALTADA DE 1.60 X 0.60 M	C/U	1.00	B/.350.00	B/.350.00
501427	SILLAS PLSTICAS	C/U	3.00	B/.65.00	B/.195.00
50169	MICROONDAS DE 1.1 PIE CUBICOS	C/U	1.00	B/.85.00	B/.85.00
501076	CAFETERA DE DOCE (12) TAZAS	C/U	1.00	B/.75.00	B/.75.00
94739	MESA REDONDA DE MADERA DE 0.40 M DE DIAMETRO	C/U	1.00	B/.350.00	B/.350.00
COCINA					B/.3,140.00
5014531	NEVERA DE DOS (2) PUERTAS DE 19 PIE CUBICOS	C/U	1.00	B/.1,200.00	B/.1,200.00
9411140	ESTUFA DE INDUCCIÓN ELECTRICA DE CUATRO (4) QUEMADORES	C/U	1.00	B/.500.00	B/.500.00
941064	FREGADOR DOBLE DE ALUMINIO CON SU GRIFERÍA COMPLETO	C/U	1.00	B/.90.00	B/.90.00
71277	MUEBLE DE 0.90 X 0.60 X 3.50 EN FORMA DE "L", DE MADERA OSCURA BARNIZADA	C/U	1.00	B/.700.00	B/.700.00
71274	MUEBLE AEREO DE MADERA OSCURA BARNIZADA CON VIDRIO DE 1.00 X 0.30 X 2.00 M	C/U	1.00	B/.650.00	B/.650.00
MOBILIARIO					B/.30,640.00
501380	SILLA ALTA EN ESTRUCTURA SILVER, ASIENTO Y RESPALDAR DE TELA DE 0.45 X 0.48 X 1.00 M	C/U	20.00	B/.315.00	B/.6,300.00
94747	MESA REVESTIDA DE LAMINA DE PVC QUE SIMULEN PIEDRA COMO GRANITO O MARMOL NEGRO CON ESTRUCTURA PERFILES DE AC. GALV. ANCLADAS A LAS PAREDES DE 11.00 X 0.60 X 1.20 M	C/U	1.00	B/.315.00	B/.315.00



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

6212	ESCRITORIO DE 0.80 X 0.30 X 0.75 M	C/U	3.00	B/.250.00	B/.750.00
72325	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDAR BLANCO	C/U	3.00	B/.315.00	B/.945.00
501443	SILLA DE VISITA CON ASIENTO DE TELA Y ESTRUCTURA EN BK, COLOR GRIS	C/U	5.00	B/.120.00	B/.600.00
501041	SILLA DE VISITA CON ASIENTO DE TELA Y ESTRUCTURA EN BK, COLOR NARANJA	C/U	8.00	B/.120.00	B/.960.00
501454	SILLA DE VISITA CON ASIENTO DE TELA Y ESTRUCTURA EN BK, COLOR AZUL	C/U	8.00	B/.120.00	B/.960.00
941166	SOFA DE CUERO DE DOS (2) PUESTOS	C/U	2.00	B/.600.00	B/.1,200.00
94738	MESITA DE CENTRO DE 0.47 M DE DIAMETRO	C/U	2.00	B/.150.00	B/.300.00
94141	ESCRITORIO RECTANGULAR ANCLADO A LA PARED DE 1.40 X 0.60 M	C/U	5.00	B/.515.00	B/.2,575.00
94152	ESCRITORIO RECTANGULAR ANCLADO A LA PARED DE 1.20 X 0.60 M	C/U	4.00	B/.315.00	B/.1,260.00
94163	ESCRITORIO RECTANGULAR ANCLADO A LA PARED DE 1.00 X 0.60 M	C/U	3.00	B/.315.00	B/.945.00
6313	ESCRITORIO 25 MM MFC DE 1.40 X 0.60 X 0.75 M CON GROMMET PLASTICO EN COLOR PLATA	C/U	3.00	B/.315.00	B/.945.00
94111117	SILLA PLASTICA COLOR CELESTE CON ESTRUCTURA EN BK	C/U	14.00	B/.120.00	B/.1,680.00
941194	MESA DE CONFERENCIA CUADRADA DE 0.90 X 0.75 M	C/U	6.00	B/.600.00	B/.3,600.00
6414	ESCRITORIO 25 MM MFC DE 1.20 X 0.60 X 0.75 M CON GROMMET PLASTICO EN COLOR PLATA	C/U	7.00	B/.315.00	B/.2,205.00
501426	TABURETE CIRCULAR CON RUEDAS, ASIENTO DE TELA DE 0.40 D DIAMETRO CON	C/U	14.00	B/.120.00	B/.1,680.00

WWW.GRUPOANCHOR.COM

☎ Teléfono: 224-6675

📍 B/.120.00

📍 Edificio Katana. Local #2

Calle W - Parque Lefevre

Panamá, República de Panamá

✉ administracion@grupoanchor.com



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

	ALTURA AJUSTABLE DE 0.42 @0.48 M				
6219	TABLERO DE 1.18 X 0.53X 2.90 M	C/U	2.00	B/.150.00	B/.300.00
6285	MESA ALTA DE MADERA, COLOR AMARILLO DE 1.20 X 0.60 X 1.17 M	C/U	1.00	B/.120.00	B/.120.00
112114	SOFA TAPIZADO EN CUERINA DOS (2) PUESTOS	C/U	4.00	B/.600.00	B/.2,400.00
501146	SOFA TAPIZADO EN CUERINA TRES (3) PUESTOS	C/U	1.00	B/.600.00	B/.600.00
ELECTRICIDAD					B/.31,245.00
81508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE 30 CIRCUITOS MONOFASICOS 120/240 V. 225 AMP, CON CONDUCTORES ACCESORIOS COMPLETOS	C/U	1.00	B/.3,000.00	B/.3,000.00
86643	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9 LAS 120 V CON ACCESORIOS, DETECTORES Y ESTACIONES COMPLETO	C/U	1.00	B/.3,000.00	B/.3,000.00
81158	W. LUZ BLANCA CALIDO CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIAS, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS, COMPLETAS	C/U	32.00	B/.65.00	B/.2,080.00
94841	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE SENCILLO DE 110 V CON CAJAS DE 4X4, TAPAS DE REPELLO, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, ACCESORIOS COMPLETOS	C/U	60.00	B/.65.00	B/.3,900.00
86126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES GFCI 110 V, CON CAJAS 4 X4, TAPAS DE REPELLO, TAPAS DE PROTECCIÓN PARA PISOS, TUBERIAS, CONECTORES, CABLEADO, COMPLETO	C/U	11.00	B/.65.00	B/.715.00

WWW.GRUPOANCHOR.COM

administracion@grupoanchor.com

☎ Teléfono: 224-6675

📍 **Edificio Katana.** Local #2
Calle W - Parque Lefevre
Panamá, República de Panamá



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

090902	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220V CON CAJAS 4 X4 TPAS DE REPELLO, TAPAS DE PROTECCIÓN, TUBERIAS, CONECTORES Y CABLEADO COMPLETO	C/U	9.00	B/.65.00	B/.585.00
46292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SALIDA, LUMINOSOS CON SUS ACCESORIOS	C/U	9.00	B/.85.00	B/.765.00
8213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO	C/U	22.00	B/.50.00	B/.1,100.00
8467	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL CON SUS ACCESORIOS	C/U	3.00	B/.150.00	B/.450.00
50112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO DE BUEY CONVENCIONAL LED DE TECHO EMPOTRADOS 15W, LUZ BLANCA CALIDO CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS COMPLETOS	C/U	33.00	B/.20.00	B/.660.00
501377	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED DE TECHO EMPOTRADAS REDONDAS, IP40, IMPERMEABLES, 15W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS, COMPLETA	C/U	12.00	B/.25.00	B/.300.00
8210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LINEALES CON AROS DE CINCO (5) ESPACIOS LED 20 W, LUZ BLANCA CALIDA CON CAJAS DE PASO, CONDUCTORES, TUBERIA, CONECTORES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS COMPLETOS	C/U	10.00	B/.65.00	B/.650.00

📞 Teléfono: 224-6675

📍 **Edificio Katana**, Local #2
 Calle W - Parque Lefevre
 Panamá, República de Panamá

✉️ administracion@grupoanchor.com

WWW.GRUPOANCHOR.COM



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

8215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE PARED, TIPO DE LED, INCLUYE: CABLEADO Y ACCESORIOS, COMPLETA	C/U	2.00	B/.30.00	B/.60.00
8131	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE SWITCH PARA INTERNET, TELEFONOS, INCLUYE: CABLE COAXIAL, CAJAS MOLDURAS Y ACCESORIOS, COMPLETO	C/U	19.00	B/.20.00	B/.380.00
845	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ACONDICIONAR NUEVAS CARGAS A TAPIA EXISTENTE, INCLUYE: INTERRUPTORES PRINCIPALES PARA MDP EXISTENTE CON CABLEADO Y ACCESORIOS COMPLETOS	C/U	1.00	B/.3,500.00	B/.3,500.00
8250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12,000 BTU, CON SUS ACCESORIOS	C/U	2.00	B/.700.00	B/.1,400.00
82421	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICONADO SPLIT DE 24,000 BTU CON SUS ACCESORIOS	C/U	3.00	B/.900.00	B/.2,700.00
82216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO CASSETTE DE 36,000 BTU CON SUS ACCESORIOS	C/U	4.00	B/.1,500.00	B/.6,000.00
SISTEMA DE VOZ Y DATA					B/.5,403.72
86318	TUBERIA FICHADA VOZ Y DATOS 3/4"	C/U	60.00	B/.35.00	B/.2,100.00
5014199	PUNTO DE VOZ Y DATOS UTP CAT 6	C/U	60.00	B/.35.00	B/.2,100.00
94745	ARMARIO PARA SISTEMA ESTRUCTURADO DE 0.60 X 0.45 M	C/U	2.00	B/.83.33	B/.166.66
150501	RACK 42 CANALES CAT 6	C/U	2.00	B/.163.33	B/.326.66
69124	FLACE PLACA CAT 6	C/U	60.00	B/.2.50	B/.150.00
75123	JACK CAT 6 ROJO	C/U	60.00	B/.4.67	B/.280.20
21012	JACK CAT 6 AZUL	C/U	60.00	B/.4.67	B/.280.20
SISTEMA DE SEGURIDAD					B/.3,082.28



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
 COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
 RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675

FAX:

E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

83293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES MAGNETICOS DE APERTURA DE PUERTA	C/U	3.00	B/.55.00	B/.165.00
83292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA	C/U	2.00	B/.66.67	B/.133.34
8243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL NUMERICO	C/U	2.00	B/.236.67	B/.473.34
83287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE SEGURIDAD	C/U	1.00	B/.476.67	B/.476.67
86219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE ALIMENTACIÓN CAJA AC 110 V SALIDA DC 12V, 5 AMP DE ENTRADA DE METAL PARA	ML	71.00	B/.25.83	B/.1,833.93
PLOMERIA					B/.2,375.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 1/2" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE	ML	35.00	B/.25.00	B/.875.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 4" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE	ML	25.00	B/.25.00	B/.625.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 2" DE DIAMETRO PARA AGUAS NEGRAS	ML	30.00	B/.25.00	B/.750.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO PARA AGUAS NEGRAS	ML	5.00	B/.25.00	B/.125.00
TOTAL DEL PROYECTO					B/.144,447.52
ITBMS					B/.10,111.33
TOTAL DE PROPUESTA					B/.154,558.85

WWW.GRUPOANCHOR.COM

☎ Teléfono: 224-6675

📍 **Edificio Katana**, Local #2
 Calle W - Parque Lefevre
 Panamá, República de Panamá

✉ administracion@grupoanchor.com



PLAN DE PROPUESTA DEL PROYECTO

LICITACIÓN POR MEJOR VALOR: 61537
COMPAÑÍA PROPONENTE: GRUPO ANCHOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96

TELEFONO: 224-6675
FAX:
E-MAIL: recepcion@grupoanchor.com

Nota:

1. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR EN SU PROPUESTA EL PAGO DE IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN. EL REGLÓN ITBMS SOLO SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002.
2. El Desglose de precios es un listado de actividades y Costos que se realizaran en el Proyecto requerido para facilitar los pagos parciales a EL CONTRATISTA y llevar el control de la obra. En ningún momento tiene como implicación que el contrato suscrito por la empresa adjudicataria es un contrato por precio unitario por lo que EL PLAN exigirá la completa ejecución de la obra en base a los planos y especificaciones técnicas suministradas.
3. EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR/ELIMINAR DE LA LISTA DE ACTIVIDADES CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CONSIDERE NECESARIA AL MOMENTO DE HACER SU PROPUESTA. DE DARSE LO CONTRATACIÓN DEBERA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL LISTADO, ASI COMO CON CUALQUIRE ACTIVIDAD PRESENTE EN EL PLANO QUE HAYA OMITIDO.
4. ESTAS OMISIONESSE PAGARÁN CON EL RETENIDO DE HABER ACTIVIDADES DE MAS SE COMPENSARÁN CON UNA ORDEN DE CAMBIO. DE HABER ACTIVIDADES DE MENOS SE CONSIDERARÁ UNA OMISIÓN.
5. LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS/ELIMINADAS SERAN REVISADAS EN LA COMISIÓN EVALUADORA Y POSTERIORMENTE EVALUADAS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA HACER LA CORRECCIÓN RESPECTIVA DEL PRECIO OFICIAL EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.
6. EL RENGLON (ITBMS SOLO SERA LLENADO POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 61 DE DICIEMBRE DE 2002.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS CALENDARIOS
REPRESENTANTE LEGAL: JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
RUC DE LA COMPAÑÍA: 2568975-1-829128 DV.96




JOEL ARMANDO MOGORUZA VASQUEZ
GRUPO ANCHOR S.A.



WWW.GRUPOANCHOR.COM

- ☎ Teléfono: 224-6675
- 📍 **Edificio Katana.** Local #2
Calle W - Parque Lefevre
Panamá, República de Panamá
- ✉ administracion@grupoanchor.com


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	DIAS	Comienzo	Fin
1		PROYECTO REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA ESPACIO TECNOLOGICO PARQUE OMAR	180 días	calendario	lun 10/02/23	mar 03/19/24
2		PRELIMINARES	30 días	calendario	lun 10/02/23	lun 10/30/23
3		INSTALACIONES TEMPORALES	5 días	calendario	lun 10/02/23	vie 10/06/23
4		PLACA DE MARMOLINA	15 días	calendario	lun 10/02/23	lun 10/16/23
5		SIEMBRA DE ARBOLES	30 días	calendario	lun 10/02/23	lun 10/30/23
6		DEMOLICION DE ESTRUCTURA	44 días	calendario	lun 10/30/23	dom 12/10/23
7		DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOQUES	9 días	calendario	lun 10/30/23	mar 11/07/23
8		DEMOLICIÓN DE LOSETA DE HORMIGÓN	4 días	calendario	mar 11/07/23	sáb 11/11/23
9		DEMOLICIÓN DE SOBRE DE LAVAMANOS	4 días	calendario	sáb 11/11/23	mié 11/15/23
10		DEMOLICIÓN DE MACETAS RELLENAS	4 días	calendario	mié 11/15/23	dom 11/19/23
11		DEMOLICIÓN DEL MUEBLE DE COCINA	4 días	calendario	dom 11/19/23	mié 11/22/23
12		DEMOLICIÓN DE VENTANAS FRANCESAS	4 días	calendario	jue 11/23/23	dom 11/26/23
13		DEMOLICIÓN DE PUERTAS	3 días	calendario	dom 11/26/23	mié 11/29/23
14		DEMOLICIÓN DE TECHOS	4 días	calendario	mié 11/29/23	dom 12/03/23
15		DEMOLICIÓN DE CIELO RASO	4 días	calendario	dom 12/03/23	jue 12/07/23
16		DEMOLICIÓN DE PISO DE CERAMICA	4 días	calendario	jue 12/07/23	dom 12/10/23
17		ESTRUCTURA	5 días	calendario	dom 12/10/23	vie 12/15/23
18		CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON PULIDO	5 días	calendario	dom 12/10/23	vie 12/15/23
19		CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE CONCRETO	2 días	calendario	dom 12/10/23	mar 12/12/23
20		INSTALACION DE COLUMNAS DE TUBOS	3 días	calendario	mar 12/12/23	vie 12/15/23
21		TECHO	10 días	calendario	vie 12/15/23	dom 12/24/23
22		INSTALACION DE TECHO TRASLUCIDO	4 días	calendario	vie 12/15/23	mar 12/19/23
23		INSTALACION DE CANAL	3 días	calendario	mar 12/19/23	vie 12/22/23
24		INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES	3 días	calendario	vie 12/22/23	dom 12/24/23
25		PAREDES	11 días	calendario	mar 12/19/23	vie 12/29/23
26		CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUE	6 días	calendario	mar 12/19/23	dom 12/24/23
27		CONSTRUCCION DE PAREDES DE GYPSUM	5 días	calendario	lun 12/25/23	vie 12/29/23
28		ELECTRICIDAD	44 días	calendario	mar 12/19/23	lun 01/29/24
29		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE 30 CIRCUITOS MONOFASICOS	4 días	calendario	mar 12/19/23	sáb 12/23/23
30		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	4 días	calendario	sáb 12/23/23	mar 12/26/23
31		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES 110V SENCILLOS CABLEADOS	30 días	calendario	sáb 12/23/23	sáb 01/20/24

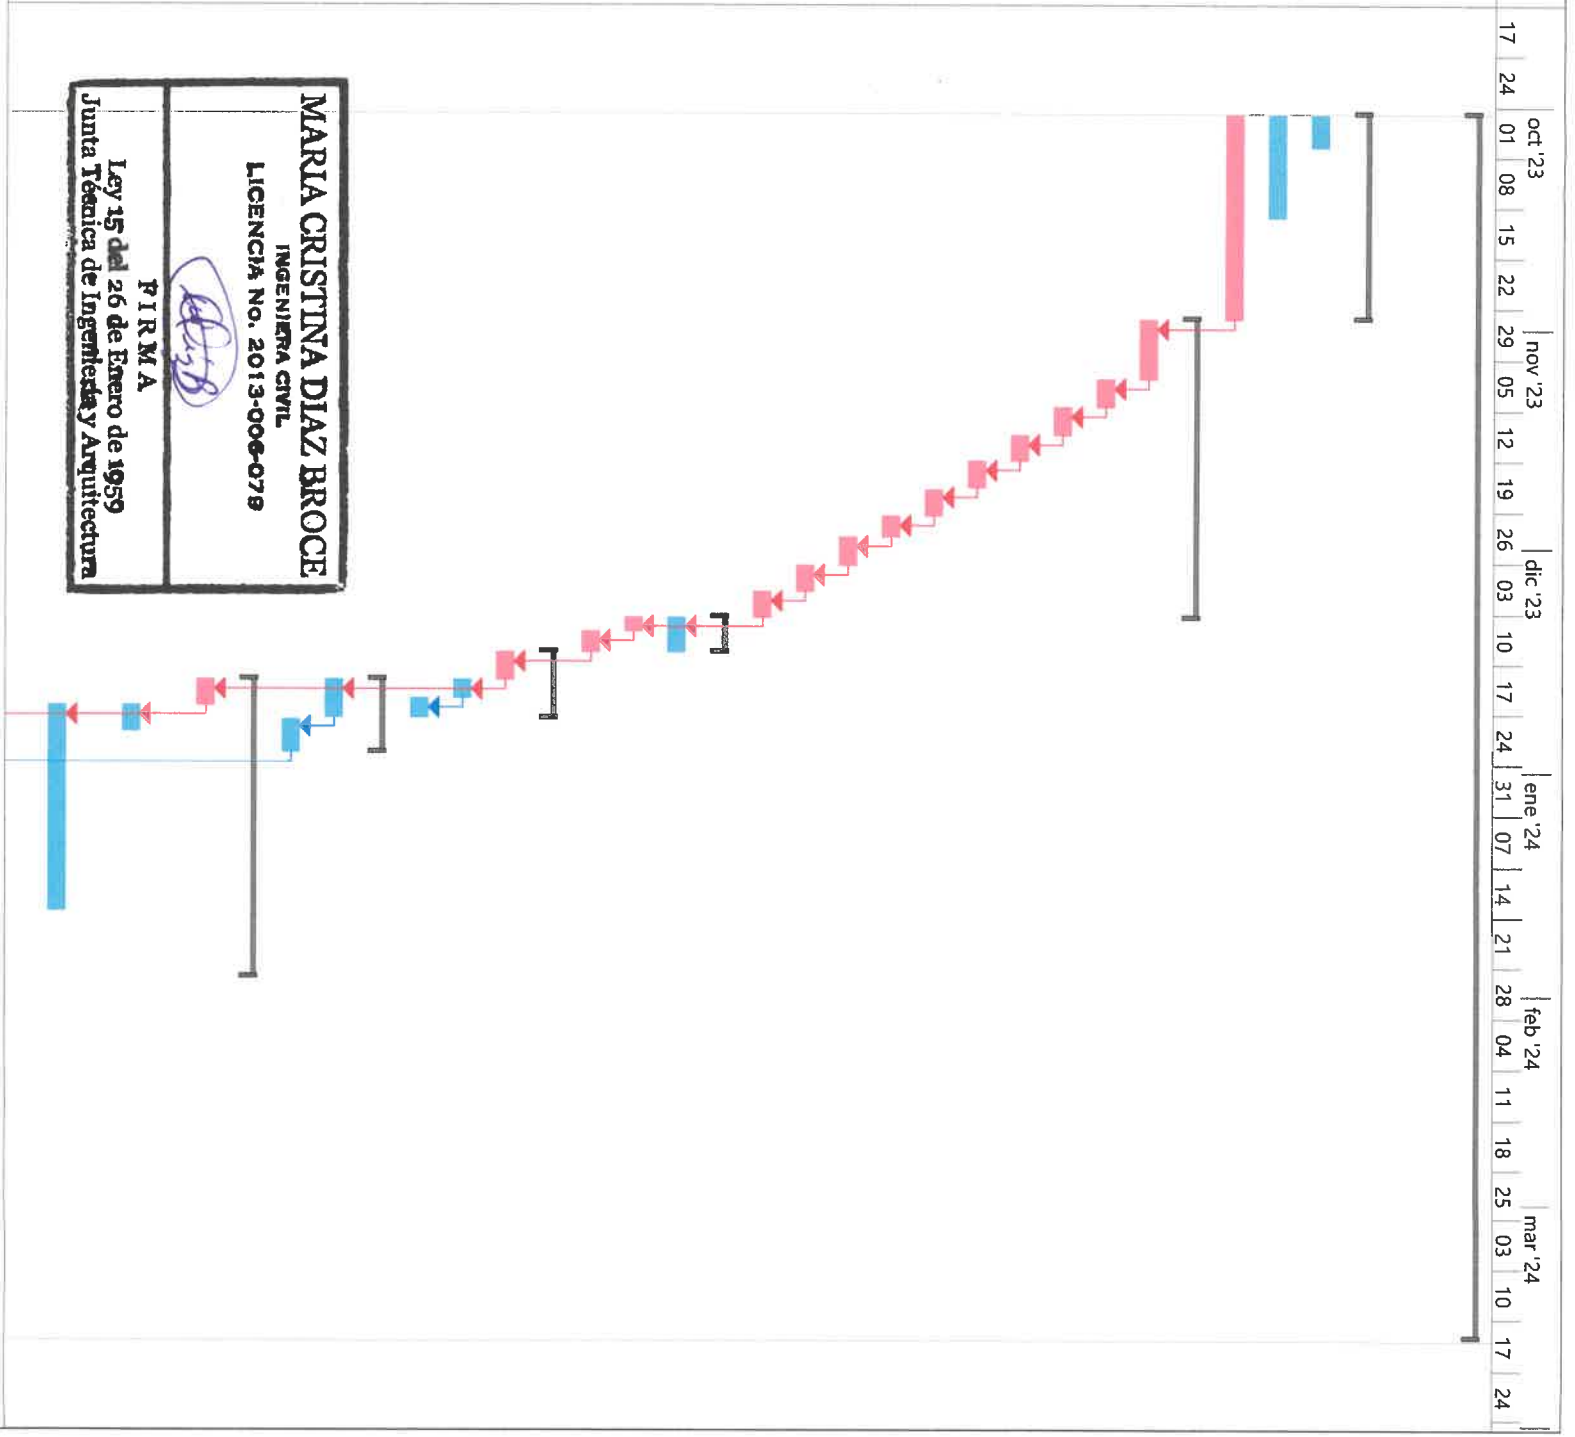

Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo Progreso manual
 División Hito inactivo Resumen manual Fecha límite
 Hito Resumen inactivo solo el comienzo Tareas críticas
 Resumen Tarea manual solo fin División crítica
 Resumen del proyecto solo duración Tareas externas Progreso

Proyecto: CRONOGRAMA DAS
Fecha: mar 09/12/23

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	DIAS	Comienzo	Fin	Gantt Chart																							
							17	24	oct '23	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	ene '24	07	14	21	28	04	11
32		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA 220 VPARA AA CABLEADOS	30 días	calendario	sáb 12/23/23	sáb 01/20/24																								
33		SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHS	4 días	calendario	sáb 01/20/24	mié 01/24/24																								
34		SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOTS	4 días	calendario	mié 01/24/24	sáb 01/27/24																								
35		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	5 días	calendario	mié 01/24/24	dom 01/28/24																								
36		SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	5 días	calendario	mié 01/24/24	dom 01/28/24																								
37		INSTALACION DE MANUAL - SIRENAS	1 día	calendario	dom 01/28/24	lun 01/29/24																								
38		PLOMERIA	4 días	calendario	vie 12/29/23	mar 01/02/24																								
39		INSTALACION DE AGUA POTABLE	4 días	calendario	vie 12/29/23	mar 01/02/24																								
40		INSTALACION DE AGUAS SANITARIAS	4 días	calendario	vie 12/29/23	mar 01/02/24																								
41		VOZ Y DATA	16 días	calendario	dom 01/28/24	lun 02/12/24																								
42		TUBERIA FICHADAS VOZ Y DATOS	4 días	calendario	dom 01/28/24	jue 02/01/24																								
43		ARMARIO PARA SISTEMAS ESTRUCTURADOS	4 días	calendario	jue 02/01/24	lun 02/05/24																								
44		RACK 42 CANALES	4 días	calendario	lun 02/05/24	vie 02/09/24																								
45		JACK CAT 6 ROJO Y AZUL	4 días	calendario	vie 02/09/24	lun 02/12/24																								
46		VENTANAS	4 días	calendario	vie 12/29/23	mar 01/02/24																								
47		INSTALACION DE VENTANAS FRANCEAS	1 día	calendario	vie 12/29/23	sáb 12/30/23																								
48		INSTALACION DE VENTANAS DE VIDRIO CON PERFIL DE ALUMINIO	3 días	calendario	sáb 12/30/23	mar 01/02/24																								
49		ACABADOS	11 días	calendario	jue 02/01/24	dom 02/11/24																								
50		INSTALACION DE PISOS	5 días	calendario	jue 02/01/24	mar 02/06/24																								
51		CONFECCION DE NICHO DE GYPSUM	4 días	calendario	jue 02/01/24	lun 02/05/24																								
52		APLICACIÓN DE PINTURA DE PAREDES	8 días	calendario	jue 02/01/24	vie 02/09/24																								
53		INSTALACION DE PAPEL TAPIZ	3 días	calendario	vie 02/09/24	dom 02/11/24																								
54		PUERTAS	4 días	calendario	vie 02/09/24	lun 02/12/24																								
55		INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	2 días	calendario	vie 02/09/24	sáb 02/10/24																								
56		INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE VIDRIO	2 días	calendario	dom 02/11/24	lun 02/12/24																								
57		ACABADOS DE BAÑOS	18 días	calendario	dom 02/11/24	mar 02/27/24																								
58		INSTALACION DE INODOROS	2 días	calendario	dom 02/11/24	lun 02/12/24																								
59		INSTALACION DE LAVAMANOS	2 días	calendario	lun 02/12/24	mié 02/14/24																								
60		INSTALACION DE URINAL	2 días	calendario	mié 02/14/24	vie 02/16/24																								
61		CONSTRUCCION DE LAVAMANO DE CONCRETO	3 días	calendario	vie 02/16/24	lun 02/19/24																								
62		INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑOS (PORTA PAPEL, BARRAS)	2 días	calendario	lun 02/19/24	mié 02/21/24																								
63		INSTALACION DE MAMPARAS DIVISIONES DE BAÑOS	5 días	calendario	mié 02/21/24	lun 02/26/24																								
64		INSTALACION DE ESTANTERIAS DE ALUMINIO	2 días	calendario	lun 02/26/24	mar 02/27/24																								



Informe de resumen manual

Tarea inactiva:

Hitos inactivos:

Resumen inactivo:

Tarea manual:

solo duración:

Resumen manual:

solo el comienzo:

solo fin:

Tareas externas:

Hitos externos:

Fecha límite:


Tareas críticas:

División crítica:

Progreso manual:

Proyecto: CRONOGRAMA DAS
Fecha: mar 09/12/23

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	DIAS	Comienzo	Fin	Gantt Chart																											
							17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	03	10	17	24
65		ADECUAMIENTO DE CUARTO PERSONAL MANTENIMIENTOS	8 días	calendario	lun 02/12/24	mar 02/20/24																												
66		INSTALACION DE SOFA 3 PUESTOS	2 días	calendario	lun 02/12/24	mié 02/14/24																												
67		INSTALACION DE NEVERA	2 días	calendario	mié 02/14/24	vie 02/16/24																												
68		INSTALACION DE MESAS Y SILLAS	2 días	calendario	vie 02/16/24	dom 02/18/24																												
69		INSTALACION DE MICROONDAS, CAFETERAS	2 días	calendario	dom 02/18/24	mar 02/20/24																												
70		ADECUACIONES DE COCINA	11 días	calendario	lun 02/12/24	vie 02/23/24																												
71		INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA	5 días	calendario	lun 02/12/24	sáb 02/17/24																												
72		INSTALACION DE FREGADOR DOBLE	2 días	calendario	sáb 02/17/24	lun 02/19/24																												
73		INSTALACION DE ESTUFA DE INDUCCION	2 días	calendario	lun 02/19/24	mié 02/21/24																												
74		INSTALACION DE NEVERA DE 2 PUERTAS 19PIES3	2 días	calendario	mié 02/21/24	vie 02/23/24																												
75		MOBILIARIO	15 días	calendario	vie 02/23/24	vie 03/08/24																												
76		INSTALACION DE SILLA ALTA	2 días	calendario	vie 02/23/24	dom 02/25/24																												
77		INSTALACION DE MESA REVESTIDA LAMINA PVC	2 días	calendario	dom 02/25/24	lun 02/26/24																												
78		INSTALACION DE ESCRITORIOS	3 días	calendario	mar 02/27/24	jue 02/29/24																												
79		INSTALACION DE SILLAS DE ESCRITORIOS	2 días	calendario	jue 02/29/24	sáb 03/02/24																												
80		INSTALACION DE SILLAS DE VISITA	2 días	calendario	jue 02/29/24	sáb 03/02/24																												
81		INSTALACION DE SOFA DE CUERO	2 días	calendario	sáb 03/02/24	lun 03/04/24																												
82		INSTALACION DE MESA DE CONFERENCIA	2 días	calendario	sáb 03/02/24	lun 03/04/24																												
83		INSTALACION DE MESA ALTA	2 días	calendario	lun 03/04/24	mié 03/06/24																												
84		INSTALACION DE TABLERO	2 días	calendario	mié 03/06/24	vie 03/08/24																												
85		SISTEMA DE SEGURIDAD	20 días	calendario	jue 02/29/24	mar 03/19/24																												
86		INSTALACION DE SENSORES MAGNETICOS	4 días	calendario	jue 02/29/24	lun 03/04/24																												
87		INSTALACION DE SIRENAS	4 días	calendario	lun 03/04/24	vie 03/08/24																												
88		INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL NUMERICO	4 días	calendario	vie 03/08/24	mar 03/12/24																												
89		INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE SEGURIDAD	4 días	calendario	mar 03/12/24	vie 03/15/24																												
90		INSTALACION DE KITS DE ALIMENTACION CAJA AC 110V	4 días	calendario	vie 03/15/24	mar 03/19/24																												
91		INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	2 días	calendario	sáb 03/02/24	lun 03/04/24																												
92		INSTALACION DE UNIDADES DE AA	2 días	calendario	sáb 03/02/24	lun 03/04/24																												



Proyecto: CRONOGRAMA DAS
 Fecha: mar 09/12/23

Tarea
 Tarea inactiva: [Barra azul con puntos]

Informe de resumen manual
 Resumen manual: [Barra azul]

Hito
 Hito inactivo: [Barra azul con punto]

Hito externo: [Barra azul con punto]

Progreso manual
 Tareas críticas: [Barra roja]

Tareas externas: [Barra azul]

solo el comienzo
 solo fin
 solo duración

Resumen del proyecto
